

CIUDAD: Cali FECHA: 31 Julio 2018 ID EQUIPO: 32061
 OFICINA O DEPENDENCIA: Archivos de la 10 DIRECCIÓN:
 EQUIPO: 1000X CAPACIDAD: 75000 BTU
 MARCA: Carrier MODELO: 75000 BTU SERIE: 5813K0152
 UBICACIÓN EQUIPO: Control ÁREA:
 TIPO DE EQUIPO: TIPO DE REFRIGERANTE: A10A

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/CONDENSADORA)																																																							
Limpieza Interior - Exterior	☒	Limpieza Interior - Exterior	☒	Aislamiento rubatex / armaflex	☒																																																						
Lavado de Serpentes	☒	Lavado de Serpentes	☒	Filtro secador	☒																																																						
Ajuste de prisioneros de Rotores y	☒	Ajuste rotores o ventiladores	☒	Válvulas de corte	☒																																																						
Lavado filtros de aire	☒	Rodamientos	☒	Escapes tubería y accesorios	☒																																																						
Tensión de correas	☒	Ajuste general de tornillos	☒	Soportes	☒																																																						
Cambio de Correas	☒	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero	☒	Indicador de líquido	☒																																																						
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	☒	Estado de las aspas	☒	Ajuste general de tornillería	☒																																																						
Limpieza de desagües	☒	Inspección de presostatos y protecciones	☒																																																								
Revisión aislamiento interior	☒	COMPRESOR	☒	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES																																																							
Limpieza cuarto de máquinas	☒	Funcionamiento en general	☒	MANEJADORA / FANCOIL																																																							
Ajuste general de tornillos	☒	Escapes	☒	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATOS MOTOR</th> <th>HP</th> <th colspan="3">VOLTAJE</th> <th colspan="3">CONSUMO</th> <th>RPM</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>L1</td> <td>L2</td> <td>L3</td> <td>L1</td> <td>L2</td> <td>L3</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MOTOR 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MOTOR 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM			L1	L2	L3	L1	L2	L3		MOTOR 1									MOTOR 2																										
DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM																																																			
		L1	L2	L3	L1	L2	L3																																																				
MOTOR 1																																																											
MOTOR 2																																																											
Revisión general de tornillos	☒	Temperatura	☒	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES																																																							
revisión válvulas de expansión	☒	Ruidos	☒	CONDENSADORA																																																							
Revisión accesorios eléctricos y ajustes	☒	Estado soportes	☒	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATOS COMPRESOR</th> <th>HP</th> <th colspan="3">VOLTAJE</th> <th colspan="3">CONSUMO</th> <th>RPM</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>L1</td> <td>L2</td> <td>L3</td> <td>L1</td> <td>L2</td> <td>L3</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPRESOR 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESIONES</td> <td></td> <td colspan="3">ALTA</td> <td colspan="3">BAJA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMPRESOR 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESIONES</td> <td></td> <td colspan="3">ALTA</td> <td colspan="3">BAJA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DATOS COMPRESOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM			L1	L2	L3	L1	L2	L3		COMPRESOR 1									PRESIONES		ALTA			BAJA				COMPRESOR 2									PRESIONES		ALTA			BAJA			
DATOS COMPRESOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM																																																			
		L1	L2	L3	L1	L2	L3																																																				
COMPRESOR 1																																																											
PRESIONES		ALTA			BAJA																																																						
COMPRESOR 2																																																											
PRESIONES		ALTA			BAJA																																																						
Lámparas de operación y alarmas	☒	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE	☒	DATOS VENTILADOR																																																							
Revisión Voltímetros/Amperímetros	☒	Revisión Dampers	☒	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATOS VENTILADOR</th> <th>HP</th> <th colspan="3">VOLTAJE</th> <th colspan="3">CONSUMO</th> <th>RPM</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>L1</td> <td>L2</td> <td>L3</td> <td>L1</td> <td>L2</td> <td>L3</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DATOS VENTILADOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DATOS VENTILADOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM			L1	L2	L3	L1	L2	L3		DATOS VENTILADOR																																			
DATOS VENTILADOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM																																																			
		L1	L2	L3	L1	L2	L3																																																				
DATOS VENTILADOR																																																											
Revisión rele bimetálico	☒	Temperaturas de suministro	☒																																																								
Limpieza tablero eléctrico	☒	Temperaturas de retorno	☒																																																								
Limpieza tablero eléctrico	☒	Temperaturas de retorno	☒																																																								
Medición del Neutro	☒	Revisión general conductos metálicos	☒																																																								
Revisión Termostato	☒	Revisión general conductos fibra	☒																																																								
Inspección motor	☒	LIMPIEZA INTERIOR - EXTERIOR	☒																																																								
Cambio tela filtro	☒	OTROS	☒																																																								
Lavado de filtro	☒	limpieza de puntos de corrosión	☒																																																								
carga de Refrigerante	☒	Bandeja de condensado	☒																																																								
Peso de inicial del cilindro	☒	Bomba de condensado	☒																																																								
Peso final del cilindro	☒	Verificación de bombillas de señalización	☒																																																								
Estado de la acometida eléctrica	☒	Vigilador de Voltaje	☒																																																								
Estado del breaker	☒																																																										

OBSERVACIONES: Se realizó el mantenimiento al equipo y quedó funcionando en óptimas condiciones

Hora de Llegada Técnico: 2:00 Pm

Hora de Salida Técnico: 4:00 Pm
 CLIENTE

Firma de técnico HEALTHCARE NETWORK S.A.S

Firma de Aceptación del servicio a satisfacción

CIUDAD: Cabo FECHA: 31 Julio 2018 ID EQUIPO: 133 AG 2

OFICINA O DEPENDENCIA: Archivos y storero DIRECCIÓN:

EQUIPO: Lennox CAPACIDAD:

MARCA: Lennox MODELO: TS4 06054N SERIE: 5813101811

UBICACIÓN EQUIPO: central ÁREA:

TIPO DE EQUIPO: central TIPO DE REFRIGERANTE: A10 A

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/CONDENSADORA)																																																							
Limpieza Interior - Exterior	☒	Limpieza Interior - Exterior	☒	Aislamiento rubatex / armaflex	☒																																																						
Lavado de Serpentes	☒	Lavado de Serpentes	☒	Filtro secador	☒																																																						
Ajuste de prisioneros de Rotores y	☒	Ajuste rotores o ventiladores	☒	Válvulas de corte	☒																																																						
Lavado filtros de aire	☒	Rodamientos	☒	Escapes tubería y accesorios	☒																																																						
Tensión de correas	☒	Ajuste general de tornillos	☒	Soportes	☒																																																						
Cambio de Correas	☒	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero	☒	Indicador de liquido	☒																																																						
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	☒	Estado de las aspas	☒	Ajuste general de tornillería	☒																																																						
Limpieza de desagües	☒	Inspección de presostatos y protecciones	☒																																																								
Revisión aislamiento interior	☒	COMPRESOR	☒	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES																																																							
Limpieza cuarto de máquinas	☒	Funcionamiento en general	☒	MANEJADORA / FANCOIL																																																							
Ajuste general de tornillos	☒	Escapes	☒	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATOS MOTOR</th> <th>HP</th> <th colspan="3">VOLTAJE</th> <th colspan="3">CONSUMO</th> <th>RPM</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>L1</th> <th>L2</th> <th>L3</th> <th>L1</th> <th>L2</th> <th>L3</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MOTOR 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MOTOR 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM			L1	L2	L3	L1	L2	L3		MOTOR 1									MOTOR 2																										
DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM																																																			
		L1	L2	L3	L1	L2	L3																																																				
MOTOR 1																																																											
MOTOR 2																																																											
Revisión general de tornillos	☒	Temperatura	☒	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES																																																							
revisión válvulas de expansión	☒	Ruidos	☒	CONDENSADORA																																																							
Revisión accesorios eléctricos y ajustes	☒	Estado soportes	☒	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATOS COMPRESOR</th> <th>HP</th> <th colspan="3">VOLTAJE</th> <th colspan="3">CONSUMO</th> <th>RPM</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>L1</th> <th>L2</th> <th>L3</th> <th>L1</th> <th>L2</th> <th>L3</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPRESOR 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESIONES</td> <td></td> <td colspan="3">ALTA</td> <td colspan="3">BAJA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMPRESOR 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESIONES</td> <td></td> <td colspan="3">ALTA</td> <td colspan="3">BAJA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DATOS COMPRESOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM			L1	L2	L3	L1	L2	L3		COMPRESOR 1									PRESIONES		ALTA			BAJA				COMPRESOR 2									PRESIONES		ALTA			BAJA			
DATOS COMPRESOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM																																																			
		L1	L2	L3	L1	L2	L3																																																				
COMPRESOR 1																																																											
PRESIONES		ALTA			BAJA																																																						
COMPRESOR 2																																																											
PRESIONES		ALTA			BAJA																																																						
Lámparas de operación y alarmas	☒	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE	☒	DATOS VENTILADO R																																																							
Revisión Voltímetros/Amperímetros	☒	Revisión Dampers	☒	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATOS VENTILADO R</th> <th>HP</th> <th colspan="3">VOLTAJE</th> <th colspan="3">CONSUMO</th> <th>RPM</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>L1</th> <th>L2</th> <th>L3</th> <th>L1</th> <th>L2</th> <th>L3</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DATOS VENTILADO R	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM			L1	L2	L3	L1	L2	L3																																					
DATOS VENTILADO R	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM																																																			
		L1	L2	L3	L1	L2	L3																																																				
Revisión rele bimetálico	☒	Temperaturas de suministro	☒																																																								
Limpieza tablero eléctrico	☒	Temperaturas de retorno	☒																																																								
Limpieza tablero eléctrico	☒	Temperaturas de retorno	☒																																																								
Medición del Neutro		Revisión general conductos metálicos	☒																																																								
Revisión Termostato	☒	Revisión general conductos fibra	☒																																																								
Inspección motor	☒	LIMPIEZA INTERIOR - EXTERIOR	☒																																																								
Cambio tela filtro	☒	OTROS	☒																																																								
Lavado de filtro	☒	limpieza de puntos de corrosión	☒																																																								
carga de Refrigerante	☒	Bandeja de condensado	☒																																																								
Peso de inicial del cilindro	☒	Bomba de condensado	☒																																																								
Peso final del cilindro	☒	Verificación de bombillas de señalización	☒																																																								
Estado de la acometida eléctrica	☒	Vigilador de Voltaje	☒																																																								
Estado del breaker	☒																																																										

OBSERVACIONES: Se realizó el mantenimiento al equipo y quedó funcionando en optimas condiciones

Hora de Llegada Técnico: 2:00 P.m

Hora de Salida Técnico: 4:00 P.m
CLIENTE

Firma de técnico HEALTHCARE NETWORK S.A.S

Firma de Aceptación del servicio a satisfacción

CIUDAD: <u>CAP</u>	FECHA: <u>8 agosto 2018</u>	ID EQUIPO: <u>40 Act</u>
OFICINA O DEPENDENCIA: <u>Suba oval</u>	DIRECCIÓN:	
EQUIPO:	CAPACIDAD:	
MARCA: <u>Egyptrac</u>	MODELO: <u>KE 104 036 41</u>	SERIE:
UBICACIÓN EQUIPO: <u>Parroquia</u>	ÁREA:	
TIPO DE EQUIPO: <u>Central</u>	TIPO DE REFRIGERANTE: <u>R-22</u>	

UNIDAD MANEJADORA	UNIDAD CONDENSADORA	REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/CONDENSADORA)
Limpieza Interior - Exterior ☒	Limpieza Interior - Exterior ☒	Aislamiento rubatex / armaflex ☒
Lavado de Serpentes ☒	Lavado de Serpentes ☒	Filtro secador ☒
Ajuste de prisioneros de Rotores y ☒	Ajuste rotores o ventiladores ☒	Válvulas de corte ☒
Lavado filtros de aire ☒	Rodamientos ☒	Escapes tubería y accesorios ☒
Tensión de correas ☒	Ajuste general de tornillos ☒	Soportes ☒
Cambio de Correas ☒	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero ☒	Indicador de liquido ☒
Revisión y lubricacion de Rodamientos motor - ☒	Estado de las aspas ☒	Ajuste general de tornillería ☒
Limpieza de desagües ☒	Inspeccion de presostatos y protecciones ☒	
Revisión aislamiento interior ☒	COMPRESOR ☒	
Limpieza cuarto de máquinas ☒	Funcionamiento en general ☒	
Ajuste general de tornillos ☒	Escapes ☒	
Revisión general de tornillos ☒	Temperatura ☒	
revisión válvulas de expansión ☒	Ruidos ☒	
Revisión accesorios eléctricos y ajustes ☒	Estado soportes ☒	
Lámparas de operación y alarmas ☒	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE ☒	
Revisión Voltímetros/Amperímetros ☒	Revisión Dampers ☒	
Revisión rele bimetálico ☒	Temperaturas de suministro ☒	
Limpieza tablero eléctrico ☒	Temperaturas de retorno ☒	
Limpieza tablero eléctrico ☒	Temperaturas de retorno ☒	
Medicion del Neutro ☒		
Revisión Termostato ☒	Revisión general conductos metalicos ☒	
Inspección motor ☒	Revisión general conductos fibra ☒	
Cambio tela filtro ☒	LIMPIEZA INTERIOR - EXTERIOR ☒	
Lavado de filtro ☒	OTROS ☒	
carga de Refrigerante ☒	limpieza de puntos de corrosion ☒	
Peso de inicial del cilindro ☒	Bandeja de condensado ☒	
Peso final del cilindro ☒	Bomba de condensado ☒	
Estado de la acometida electrica ☒	Verificacion de bombillas de señalizacion ☒	
Estado del breaker ☒	Vigilador de Voltaje ☒	

OBSERVACIONES: Se realiza el mantenimiento preventivo al equipo.

Hora de Llegada Técnico: 9:00 Am Hora de Salida Técnico: 11:15 Am

Firma de técnico HEALTHCARE NETWORK S.A.S. Firma de Aceptación del servicio a satisfacción

[Firma de técnico] *[Firma de Aceptación del servicio a satisfacción]*

ID EQUIPO	TIPO DE AIRE	DESPACHO	TIPO DE GAS	MARCA
HT 1	AIRE CENTRAL	UAESPM1	R22	EQUIPRAC
HT 2	AIRE CENTRAL	UAESPM2	R22	EQUIPRAC
HT 3	AIRE CENTRAL	UAESPM3	R22	EQUIPRAC
HT 4	AIRE CENTRAL	AUDITORIO SOTANO	R22	EQUIPRAC
HT 5	SPLIT	ALMACEN OFIC. 201	410A	MIRAGE
HT 6	AIRE CENTRAL	SALA EXPOSICION 1	R22	COLCLIMA
HT 7	AIRE CENTRAL	TAKAESHIMA 1	R22	EQUIPRAC
HT 8	AIRE CENTRAL	ALMACEN OFIC. 201	R22	EQUIPRAC
HT 9	SPLIT	ARCHIVO ADMON	410A	MIRAGE
HT 10	SPLIT	ACESOR JURIDICO	410A	INNOVAIR
HT 11	SPLIT	ACESOR DESPACHO	410A	INNOVAIR
HT 12	SPLIT	DESPACHO OFIC.302	410A	INNOVAIR
HT 13	SPLIT	SECRETARIA DESP.	410A	MIRAGE
HT 14	SPLIT	SALA DE JUNTAS	410A	INNOVAIR
HT 15	PISO TECHO	SALON OVAL	HIB.R22/410A	INNOVAIR
HT 16	SPLIT	DESPACHO ALCALDE	410A	INNOVAIR
HT 17	SPLIT	OFICINA 305	410A	INNOVAIR
HT 18	SPLIT	PLANEACION INST	410A	INNOVAIR
HT 19	SPLIT	PLANEACION INST 2	410A	INNOVAIR
HT 20	SPLIT	PLAN. INST. ESTRATEGIA	410A	INNOVAIR
HT 21	SPLIT	OFICINA 308	410A	INNOVAIR
HT 22	SPLIT	SALON MADERA	410A	MIRAGE
HT 23	SPLIT	SALON MAD. COMUN.	410A	MIRAGE
HT 24	SPLIT	RED BIBLIOTECAS	R22	SAMSUNG
HT 25	AIRE CENTRAL	SALA ADMINISTRACION	R22	EQUIPRAC
HT 26	AIRE CENTRAL	SALA ADMINISTRACION 2	R22	EQUIPRAC
HT 27	AIRE CENTRAL	CORFECALI	R22	EQUIPRAC
HT 28	AIRE CENTRAL	SALA DE EXPOSICION 2	R22	EQUIPRAC
HT 29	AIRE CENTRAL	SALA DE EXPOSICION 2	R22	EQUIPRAC
HT 30	SPLIT	SALA DE SISTEMA	R22	CONFORFREST
HT 31	SPLIT	RACK PLANEACION	R22	CONFORTALL
HT 32	AIRE CENTRAL	ARCHIVO HISTORICO	410A	LENNOX
HT 33	AIRE CENTRAL	ARCHIVO HISTORICO 2	410A	LENNOX
HT 34	SPLIT	SALA DE CINE 218	R22	TEMPSTAR
HT 35	SPLIT	SALA DE CINE 2 OFIC. 218	R22	TEMPSTAR
HT 36	AIRE CENTRAL	DEPOSITO DE PELICULAS	R22	TEMPSTAR
HT 37	AIRE CENTRAL	SALON MADERA	R22	EQUIPRAC
HT 38	AIRE CENTRAL	SALON MADERA 2	R22	EQUIPRAC
HT 39	SPLIT	OFICINA 108	R22	TEMPSTAR
HT 40	AIRE CENTRAL	SALON OVAL 2	R22	EQUIPRAC
HT 41	AIRE CENTRAL	SALON OVAL 3	R22	EQUIPRAC
HT 42	CHILLER 1	AREAS COMUNES P.3	R22	MTC
HT 43	CHILLER 2	AREAS COMUNES P.3	R22	MTC
HT 44	SPLIT	VIVE DIGITAL RACK	R22	SAMSUNG
HT 45	SPLIT	DIGITAL CAPACITACION	R22	BLUELINE
HT 46	PISO TECHO	DIGITALZONA COMUN	HIB.R22/410A	CONFORFREST
HT 47	AIRE CENTRAL	CAMERINO SEGURIDAD	R22	EQUIPRAC
HT 48	AIRE CENTRAL	BIBLIOTECA INFANTIL	R22	EQUIPRAC
HT 49	AIRE CENTRAL	BIBLIOTECA	R22	EQUIPRAC
HT 50	SPLIT	BIBLIOTECA INFANTIL	410A	SAMSUNG
HT 51	SPLIT	OFICINA CIMACON	R22	TEMPSTAR
HT 52	AIRE CENTRAL	RESTAURANTE	R22	EQUIPRAC
HT 53	SPLIT	CUARTO TECNICO SONIDO	R22	TEMPSTAR
HT 54	SPLIT	CUARTO TECNICO SONIDO 2	R22	TEMPSTAR
HT 55	AIRE CENTRAL	SALA DE AUDIO VISUALES	R22	AFUCCINI
HT 56	AIRE CENTRAL	SALA JORGE LUIS BONET	R22	AFUCCINI
HT 57	AIRE CENTRAL	OFIC. 102 Y 103	R22	AFUCCINI
HT 58	AIRE CENTRAL	INFRESTRUCTURA 214 Y 217	R22	AFUCCINI
HT 59	AIRE CENTRAL	ESTUDIO HISPANO CALI	R22	AFUCCINI
HT 60	AIRE CENTRAL	GESTION DOCUMENTAL	R22	AFUCCINI
HT 61	AIRE CENTRAL	ADMN. BIENES E INMUEBLES	R22	AFUCCINI
HT 62	AIRE CENTRAL	PLANEACION 305,306 Y 307	R22	AFUCCINI
HT 63	AIRE CENTRAL	DESPACHO	R22	AFUCCINI
HT 64	AIRE CENTRAL	ALMACEN SOTANO	R22	AFUCCINI

Inten 3.

HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	25/05/2018	ID EQUIPO	HT 01
OFICINA O DEPENDENCIA:	CASA DE LA CULTURA	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :		60.000 BTU		
MARCA:	EQUIPRAC	MODELO:	E10V060H1	SERIE MANEJADORA:	A008263
SERIE CONDENSADORA	H90482934	UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA	ÁREA:	UAESPM1
TIPO DE EQUIPO:	AIRE CENTRAL		TIPO DE REFRIGERANTE:	R22	

ANEXO FOTOGRAFICO



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	25/05/2018	ID EQUIPO	HT 02
OFICINA O DEPENDENCIA:	CASA DE LA CULTURA	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :		48.000 BTU		
MARCA:	EQUIPRAC	MODELO:	E10048H1	SERIE MANEJADORA:	E804399
SERIE CONDENSADORA	E804399	UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA	ÁREA:	UAESPM2
TIPO DE EQUIPO:	AIRE CENTRAL	TIPO DE REFRIGERANTE:	R22		

ANEXO FOTOGRAFICO


OBSERVACION: LA CONDENSADORA NO ENCIENDE



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARÍA DE CULTURA


CIUDAD:	CALI	FECHA:	25/05/2018	ID EQUIPO	HT 03
OFICINA O DEPENDENCIA:	CASA DE LA CULTURA	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :		36.000 BTU		
MARCA:	EQUIPRAC	MODELO:	E10V036HI	SERIE MANEJADORA:	E804381
SERIE CONDENSADORA	E802938	UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA	ÁREA:	UAESPM3
TIPO DE EQUIPO: AIRE CENTRAL	TIPO DE REFRIGERANTE:		R22		

ANEXO FOTOGRAFICO

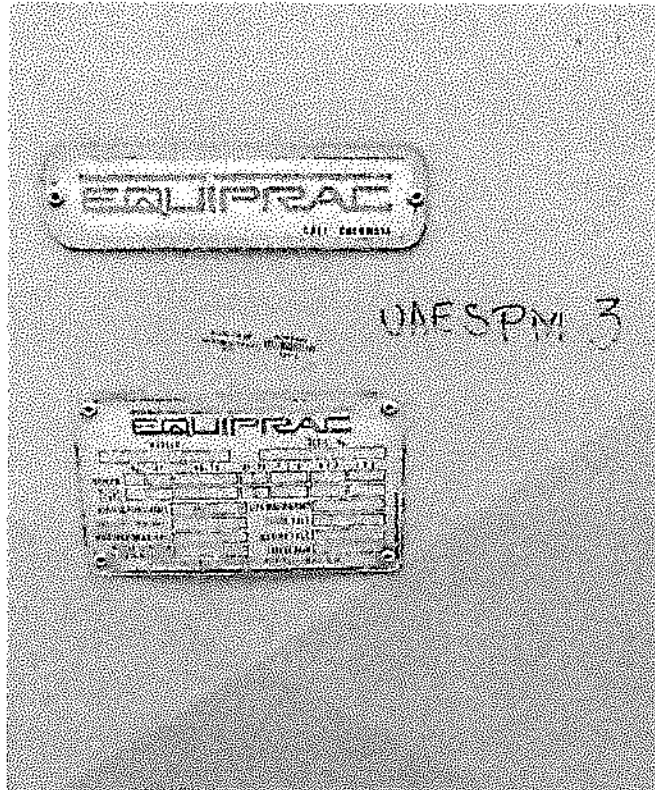

HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	25/05/2018	ID EQUIPO	HT 04
OFICINA O DEPENDENCIA:	CASA DE LA CULTURA	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :				
MARCA:	EQUIPRAC	MODELO:	E10V044S2	SERIE MANEJADORA:	H921714
SERIE CONDENSADORA	G921291	UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA	ÁREA:	AUDITORIO SOTANO
TIPO DE EQUIPO:	AIRE CENTRAL DE 2 COMPRESORES		TIPO DE REFRIGERANTE:	R22	
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA


CIUDAD:	CALI	FECHA:	25/05/2018	ID EQUIPO	HT 05
OFICINA O DEPENDENCIA:	CASA DE LA CULTURA	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :		24.000 BTU		
MARCA:	MIRAGE	MODELO:	CMF261S	SERIE MANEJADORA:	EMF261S7061600039
SERIE CONDENSADORA	UBICACIÓN EQUIPO:		TERRAZA	ÁREA:	ALMACEN SEGUNDO PISO 201
TIPO DE EQUIPO: SPLET	TIPO DE REFRIGERANTE:		410A		

ANEXO FOTOGRAFICO



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA


CIUDAD:	CALI	FECHA:	25/05/2018	ID EQUIPO	HT 06
OFICINA O DEPENDENCIA:	CASA DE LA CULTURA	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :				
MARCA:	COLCLIMA	MODELO:	SERIE MANEJADORA:		
SERIE CONDENSADORA	9101148819	UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA	ÁREA:	SALA DE EXPOCISION 1
TIPO DE EQUIPO: AIRE CENTRAL	TIPO DE REFRIGERANTE:		R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					

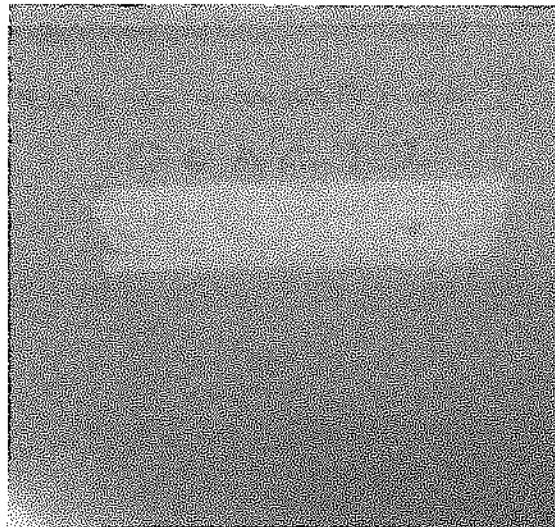

HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA


CIUDAD:	CALI	FECHA:	25/05/2018	ID EQUIPO	HT 07
OFICINA O DEPENDENCIA:	CASA DE LA CULTURA	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :		60.000 BTU		
MARCA:	EQUIPRAC	MODELO:	E10V06H1	SERIE MANEJADORA:	G953581356
SERIE CONDENSADORA	C051008C	UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA	ÁREA:	TAKAESHIMA 1
TIPO DE EQUIPO: AIRE CENTRAL	TIPO DE REFRIGERANTE:		R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					

OBSERVACION: LA MANEJADORAS TIENE DOS CONDENSADORAS

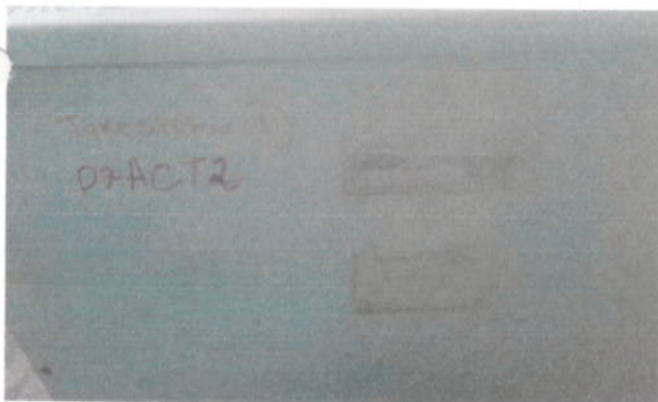

HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	25/05/2018	ID EQUIPO	HT 08
OFICINA O DEPENDENCIA:	CASA DE LA CULTURA	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :				
MARCA:	EQUIPRAC	MODELO:	E10V060HI	SERIE MANEJADORA:	G953581356
SERIE CONDENSADORA	F952639-C	UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA	ÁREA:	ALMACEN SEGUNDO PISO 201
TIPO DE EQUIPO: AIRE CENTRAL	TIPO DE REFRIGERANTE:		R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					

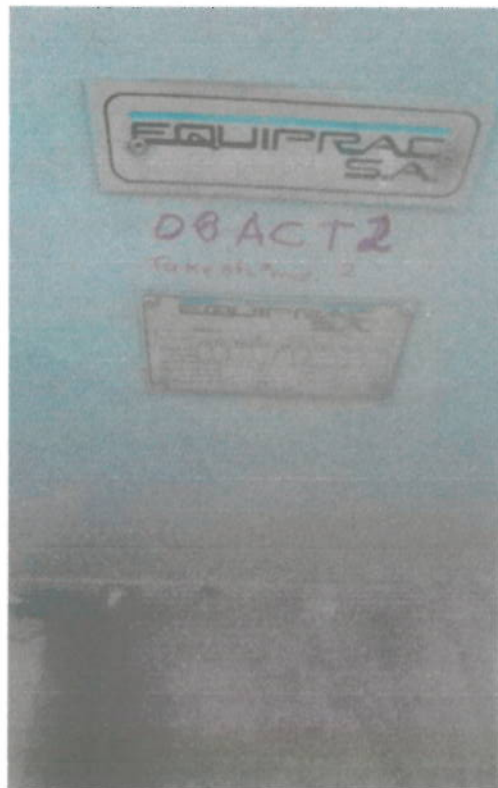

HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	25/05/2018	ID EQUIPO	HT 09
OFICINA O DEPENDENCIA:	CASA DE LA CULTURA	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:		CAPACIDAD :	12.000 BTU		
MARCA:	MIRAGE	MODELO:	CMF121S	SERIE MANEJADORA:	EMF121S
SERIE CONDENSADORA		UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA	ÁREA:	ARCHIVO ADMINISTRATIVO
TIPO DE EQUIPO: SPLIT		TIPO DE REFRIGERANTE:	410A		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	25/05/2018	ID EQUIPO	HT 10
OFICINA O DEPENDENCIA:	CASA DE LA CULTURA	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:		CAPACIDAD :	12.000 BTU		
MARCA:	INNOVAIR	MODELO:	HOE13C2MR83	SERIE MANEJADORA:	WOE13C2DV1
SERIE CONDENSADORA		UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA	ÁREA:	ACESOR JURIDICO DESPACHO
TIPO DE EQUIPO: SPLIT		TIPO DE REFRIGERANTE:	410 A		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	25/05/2018	ID EQUIPO	HT 11
OFICINA O DEPENDENCIA:	CASA DE LA CULTURA	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :		12.000 BTU		
MARCA:	INNOVAIR	MODELO:	HOE13C2MR83	SERIE MANEJADORA:	WOE13C2DV1
SERIE CONDENSADORA	UBICACIÓN EQUIPO:		TERRAZA	ÁREA:	ASESORES DE DESPACHO
TIPO DE EQUIPO: AIRE CENTRAL	TIPO DE REFRIGERANTE:		410 A		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	25/05/2018	ID EQUIPO	HT 12
OFICINA O DEPENDENCIA:	CASA DE LA CULTURA	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:		CAPACIDAD :	18.000 BTU		
MARCA:	INNOVAIR	MODELO:	SERIE MANEJADORA:	WOE18C2DV1	
SERIE CONDENSADORA	HOE18C2MR83	UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA	ÁREA:	DESPACHO OFI. 302
TIPO DE EQUIPO: SPLIT		TIPO DE REFRIGERANTE:	410A		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	25/05/2018	ID EQUIPO	HT 13
OFICINA O DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE DESPACHO	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :		18000BTU		
MARCA:	MIRAGE	MODELO:	CMF181N	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	UBICACIÓN EQUIPO:		TERRAZA	ÁREA:	ALMACEN SEGUNDO PISO 201
TIPO DE EQUIPO: MINISPILT	TIPO DE REFRIGERANTE:		410A		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	25/05/2018	ID EQUIPO	HT 14
OFICINA O DEPENDENCIA:	SALA JUNTAS DE DESPACHO	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:		CAPACIDAD :			
MARCA:	INNOVAR	MODELO:	HOE24C2MR83	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	WOE24C2DB1	UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA	ÁREA:	TERRAZA 1
TIPO DE EQUIPO: MINISPLIT		TIPO DE REFRIGERANTE:		410	
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	25/05/2018	ID EQUIPO	HT 15
OFICINA O DEPENDENCIA:	SAOLN OVAL	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :				
MARCA:	INNOVAIR	MODELO:	VEM60C2SS1	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	UBICACIÓN EQUIPO:		ÁREA:	TERRAZA 1	
TIPO DE EQUIPO: PISO TECHO	TIPO DE REFRIGERANTE:		HIBRIDO R 22 410		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	25/05/2018	ID EQUIPO	HT 16
OFICINA O DEPENDENCIA:	DESPACHO ALCALDE	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:		CAPACIDAD :	18000 BTU		
MARCA:	INNOVAIR	MODELO:	HOE18C2MR83	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA		UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA 1	ÁREA:	OFICINA 302
TIPO DE EQUIPO: MINISPLIT		TIPO DE REFRIGERANTE:	410		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CAU	FECHA:	25/05/2018	ID EQUIPO	HT 17
OFICINA O DEPENDENCIA:	OFICINA 305	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:		CAPACIDAD :	12000 BTU		
MARCA:	INNOVAIR	MODELO:	HOE13C2MR83	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA		UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA	ÁREA:	JURIDICA
TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT		TIPO DE REFRIGERANTE:	410		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	25/05/2018	ID EQUIPO	HT 18
OFICINA O DEPENDENCIA:	PLANACION INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :		12000BTU		
MARCA:	INNOVAIR	MODELO:	HOE13C2MR83	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	UBICACIÓN EQUIPO:		TERRAZA 1	ÁREA:	305
TIPO DE EQUIPO: MINISPLIT	TIPO DE REFRIGERANTE:		410		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	25/05/2018	ID EQUIPO	HT 19
OFICINA O DEPENDENCIA:	PLANACION INSTITUCIONAL 2	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:		CAPACIDAD :	12000BTU		
MARCA:	INNOVAIR	MODELO:	HOE13C2MR83	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA		UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA	ÁREA:	305
TIPO DE EQUIPO: MINISPLIT		TIPO DE REFRIGERANTE:	410		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	25/05/2018	ID EQUIPO	HT 20
OFICINA O DEPENDENCIA:	PLANEACION INSTITUCIONAL ESTRATEGICA	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:		CAPACIDAD :	18000BTU		
MARCA:	INNOVAIR	MODELO:	HOE18C2MR83	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA		UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA	ÁREA:	305
TIPO DE EQUIPO: MINISPLIT		TIPO DE REFRIGERANTE:	410		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	28/05/2018	ID EQUIPO	HT 21
OFICINA O DEPENDENCIA:	OFICINA 308	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :		12000BTU		
MARCA:	INNOVAIR	MODELO:	HOE13C2MR83	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	UBICACIÓN EQUIPO:		TERRAZA	ÁREA:	OFICINA 308
TIPO DE EQUIPO: MINISPLIT	TIPO DE REFRIGERANTE:		410		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	28/05/2018	ID EQUIPO	HT 22
OFICINA O DEPENDENCIA:	SALON MADERA ESTIMULOS	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:		CAPACIDAD :	18000BTU		
MARCA:	MIRAGE	MODELO:	CMF181N	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA		UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA 1	ÁREA:	SALON MADERA
TIPO DE EQUIPO: MINISPLIT		TIPO DE REFRIGERANTE:	410		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	28/05/2018	ID EQUIPO	HT 23
OFICINA O DEPENDENCIA:	SALON MADERA COMUNICACIONES		DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA	
EQUIPO:	CAPACIDAD :				
MARCA:	MIRAGE	MODELO:	CMF181N	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA		UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA 1	ÁREA:	ALMACEN SEGUNDO PISO 201
TIPO DE EQUIPO: MINISPLIT		TIPO DE REFRIGERANTE:	410		
ANEXO FOTOGRAFICO					




HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	28/05/2018	ID EQUIPO	HT 24
OFICINA O DEPENDENCIA:	RED DE BIBLIOTECAS	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :		24000BTU		
MARCA:	SAMSUNG	MODELO:	DC24BTVE	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	UBICACIÓN EQUIPO:		TERRAZA 1	ÁREA:	SEGUNDO PISO
TIPO DE EQUIPO: MINISPLIT	TIPO DE REFRIGERANTE:		R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					




HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	28/05/2018	ID EQUIPO	HT 25
OFICINA O DEPENDENCIA:	SALA ADMINISTRACION	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :				
MARCA:	EQUIPRAC	MODELO:	E10V060H1	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	C951017-C	UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA 2	ÁREA:	3 PISO
TIPO DE EQUIPO: AIRE CENTRAL	TIPO DE REFRIGERANTE:		R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					

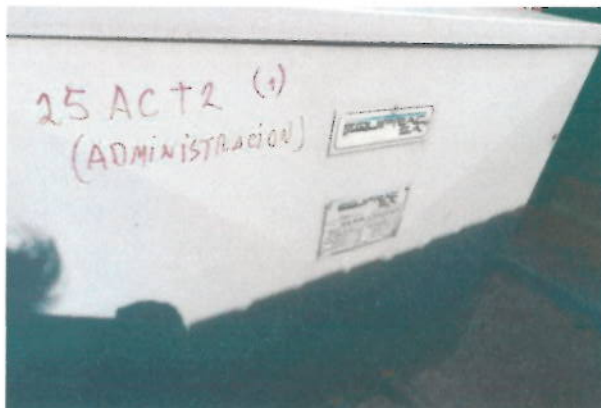

HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	28/05/2018	ID EQUIPO	HT 26
OFICINA O DEPENDENCIA:	SALA ADMINISTRACION 2	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :				
MARCA:	EQUIPRAC	MODELO:	CMF261S	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	E10V008H1	UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA 2	ÁREA:	PISO 3
TIPO DE EQUIPO: AIRE CENTRAL	TIPO DE REFRIGERANTE:		R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					

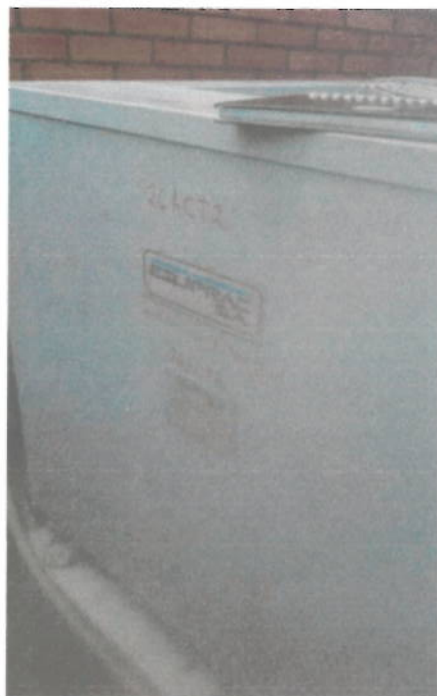

HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	28/05/2018	ID EQUIPO	HT 27
OFICINA O DEPENDENCIA:	CORFECALI	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :				
MARCA:	EQUIPRAC	MODELO:	E10V048H1	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	E8004398	UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA 2	ÁREA:	PISO 1
TIPO DE EQUIPO: AIRE CENTRAL	TIPO DE REFRIGERANTE:		R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	28/05/2018	ID EQUIPO	HT 28
OFICINA O DEPENDENCIA:	SALA DE EXPOSION 2	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	1	CAPACIDAD :			
MARCA:	EQUIPRAC	MODELO:	E10V060H1	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	H90483162	UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA 2	ÁREA:	SOTANO 2
TIPO DE EQUIPO: AIRE CENTRAL		TIPO DE REFRIGERANTE:	R22		

ANEXO FOTOGRAFICO



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	28/05/2018	ID EQUIPO	HT 29
OFICINA O DEPENDENCIA:	SALA D EXPOSICION 2	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	2	CAPACIDAD :			
MARCA:	EQUIPRAC	MODELO:	E10V042H1	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	V803644	UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA2	ÁREA:	SOTANO 2
TIPO DE EQUIPO: AIRE CENTRAL	TIPO DE REFRIGERANTE:		R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	28/05/2018	ID EQUIPO	HT 30
OFICINA O DEPENDENCIA:	SALA DE SISTEMAS	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :		60000BTU		
MARCA:	CONFORFREST	MODELO:	COED060S10C2GLVEM	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	CKL-M	UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA 2	ÁREA:	PISO 2
TIPO DE EQUIPO: SPLIT	TIPO DE REFRIGERANTE:		R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	28/05/2018	ID EQUIPO	HT 31
OFICINA O DEPENDENCIA:	RACK PLANEACION	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :				
MARCA:	CONFORTALL	MODELO:	MA1222	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	UBICACIÓN EQUIPO:		TERRAZA 2	ÁREA:	OFICINA 305
TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	TIPO DE REFRIGERANTE:		R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	28/05/2018	ID EQUIPO	HT 32
OFICINA O DEPENDENCIA:	ARCHIVO HISTORICO 1	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :				
MARCA:	LENNOX	MODELO:	TSA060S4N44Y	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	5813KO07527	UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA 2	ÁREA:	PISO 2
TIPO DE EQUIPO: AIRE CENTRAL	TIPO DE REFRIGERANTE:		410		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	29/05/2018	ID EQUIPO	HT 33
OFICINA O DEPENDENCIA:	ARCHIVO HISTORICO 2	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :				
MARCA:	LENNOX	MODELO:	TAS060S4N44Y	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	5813L01811	UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA 2	ÁREA:	PISO 2
TIPO DE EQUIPO: AIRE CENTRAL	TIPO DE REFRIGERANTE:		410		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	29/05/2018	ID EQUIPO	HT 34
OFICINA O DEPENDENCIA:	SALA DE CINE 218	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :				
MARCA:	TEMPSTAR	MODELO:	THWA24SKDC	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	UBICACIÓN EQUIPO:		TERRAZA 2	ÁREA:	PISO 2
TIPO DE EQUIPO: MINISPLT	TIPO DE REFRIGERANTE:		R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					




HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	29/05/2018	ID EQUIPO	HT 35
OFICINA O DEPENDENCIA:	SALA DE CINE2 OFICINA 218	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :				
MARCA:	TEMPSTAR	MODELO:	THWA24SKDC	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	UBICACIÓN EQUIPO:		TERRAZA 2	ÁREA:	PISO 2
TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	TIPO DE REFRIGERANTE:		R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	29/05/2018	ID EQUIPO	HT 36
OFICINA O DEPENDENCIA:	DEPOSITO PELICULAS 218	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :		18000BTU		
MARCA:	TEMPSTAR	MODELO:	CMF261S	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	UBICACIÓN EQUIPO:		TERRAZA	ÁREA:	PISO 2
TIPO DE EQUIPO: AIRE CENTRAL	TIPO DE REFRIGERANTE:		R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					

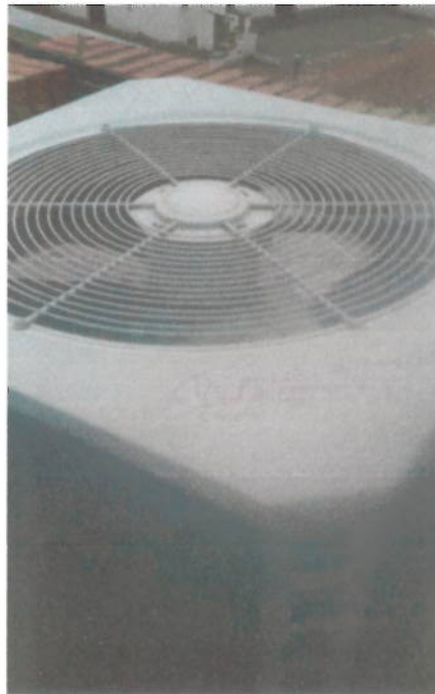

HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	29/05/2018	ID EQUIPO	HT 37
OFICINA O DEPENDENCIA:	SALON MADERA	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :				
MARCA:	EQUIPRAC	MODELO:	E10V008H1	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	K944353-C	UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA 2	ÁREA:	PISO 3
TIPO DE EQUIPO: AIRE CENTRAL	TIPO DE REFRIGERANTE:		R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	29/05/2018	ID EQUIPO	HT 38
OFICINA O DEPENDENCIA:	SALON MADERA 2	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :				
MARCA:	EQUIPRAC	MODELO:	E10V008H1	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	K944859-C	UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA 2	ÁREA:	PISO 3
TIPO DE EQUIPO: AIRE CENTRAL	TIPO DE REFRIGERANTE:		R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	29/05/2018	ID EQUIPO	HT 39
OFICINA O DEPENDENCIA:	OFICINA 108	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:		CAPACIDAD :			
MARCA:	TEMPSTAR	MODELO:	THWA24SKDC	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA		UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA 2	ÁREA:	PISO 1
TIPO DE EQUIPO: MINISPLIT		TIPO DE REFRIGERANTE:	R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	29/05/2018	ID EQUIPO	HT 40
OFICINA O DEPENDENCIA:	SALON OVAL 2	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :				
MARCA:	EQUIPRAC	MODELO:	EV10036H1	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	UBICACIÓN EQUIPO:		TERRAZA 2	ÁREA:	PISO 3
TIPO DE EQUIPO: AIRE CENTRAL	TIPO DE REFRIGERANTE:		R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					

HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	29/05/2018	ID EQUIPO	HT 41
OFICINA O DEPENDENCIA:	SALON OVAL3	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :				
MARCA:	EQUIPRAC	MODELO:	EV10036H1	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	UBICACIÓN EQUIPO:		TERRAZA 2	ÁREA:	PISO 3
TIPO DE EQUIPO: AIRE CENTRAL	TIPO DE REFRIGERANTE:		R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					



FORMATO DE HOJA DE VIDA DE EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILACION

HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	29/05/2018	ID EQUIPO	HT 42
OFICINA O DEPENDENCIA:	AREAS COMUNES	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CHILLER 1	CAPACIDAD :			
MARCA:	MTC	MODELO:	EACA040H23	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA		UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA 2	ÁREA:	PISO 3
TIPO DE EQUIPO: CHILLER 1		TIPO DE REFRIGERANTE:	R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					



FORMATO DE HOJA DE VIDA DE EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILACION

HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	29/05/2018	ID EQUIPO	HT 43
OFICINA O DEPENDENCIA:	AREAS COMUNES	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CHILLER 2	CAPACIDAD :			
MARCA:	MTC	MODELO:	EACA040H23	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA		UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA 2	ÁREA:	PISO 3
TIPO DE EQUIPO: CHILLER 2		TIPO DE REFRIGERANTE:	R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					

HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	29/05/2018	ID EQUIPO	HT 44
OFICINA O DEPENDENCIA:	VIVE DIGITAL RACK	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:		CAPACIDAD :	9000BTU		
MARCA:	SAMSUNG	MODELO:	AS097UBEX	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA		UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA 2	ÁREA:	PISO1
TIPO DE EQUIPO: MINISPLIT		TIPO DE REFRIGERANTE:	R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	29/05/2018	ID EQUIPO	HT 45
OFICINA O DEPENDENCIA:	VIVE DIGITAL CAPACITACIO	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :			36000BTU	
MARCA:	BLUELINE	MODELO:	MS3610D2	SERIE MANEJADORA:	D202079240213520130027
SERIE CONDENSADORA	UBICACIÓN EQUIPO:		TERRAZA 1	ÁREA:	PISO1
TIPO DE EQUIPO: MINISPLIT	TIPO DE REFRIGERANTE:		R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	29/05/2018	ID EQUIPO	HT 46
OFICINA O DEPENDENCIA:	VIVE DIGITAL ZONA COMUN	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:		CAPACIDAD :	48000BTU		
MARCA:	CONFORTFREST	MODELO:	COED048S10C2GLVEM	SERIE MANEJADORA:	D201489700112A16160007
SERIE CONDENSADORA	CKL-M	UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA 1	ÁREA:	PISO1
TIPO DE EQUIPO: PISO TECHO		TIPO DE REFRIGERANTE:	DUAL R22 410		
ANEXO FOTOGRAFICO					




HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	29/05/2018	ID EQUIPO	HT 47
OFICINA O DEPENDENCIA:	CAMERINO SEGURIDAD	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:		CAPACIDAD :	48000BTU		
MARCA:	EQUIPRAC	MODELO:	E10H018H1	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	A007011	UBICACIÓN EQUIPO:	TERRAZA 1	ÁREA:	PISO1
TIPO DE EQUIPO: AIRE CENTRAL		TIPO DE REFRIGERANTE:	R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					



HOJA DE VIDA AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA DE CULTURA

CIUDAD:	CALI	FECHA:	29/05/2018	ID EQUIPO	HT 48
OFICINA O DEPENDENCIA:	BIBLIOTECA INFANTIL	DIRECCIÓN:	CARRERA 5 CON SEXTA		
EQUIPO:	CAPACIDAD :				
MARCA:	EQUIPRAC	MODELO:	E10V036H1	SERIE MANEJADORA:	
SERIE CONDENSADORA	E804376	UBICACIÓN EQUIPO:	ÁREA: SOTANO 2		
TIPO DE EQUIPO: AIRE CENTRAL	TIPO DE REFRIGERANTE:		R22		
ANEXO FOTOGRAFICO					

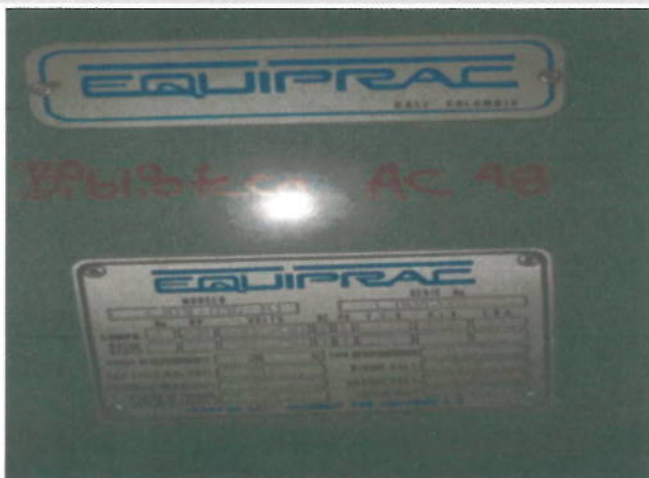

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO	Código MAJA01.02.02.18.P02.F16	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	xx/dic/2010

OBJETO DE LA OBRA:
 Prestar sus servicios para realizar EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI, UBICADO EN LA CRA 5# 6-05 LA MERCED, en el marco del proyecto denominado CONSERVACION DEL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI, según ficha EBI 06046291 vigencia 2.018. De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios previos

En el cuadro anexo se presenta EL AVANCE FOTOGRAFICO SEMANA 2 DEL CONTRATO: 4148.010.26.444 DE 2018

OBSERVACIONES TECNICAS

No.	AUDITORIO CENTRAL	
1		CHILLER 1 DE 40 TR
AUDIOVISUALES 2018		
2	 	MATENIMIENTO CORRECTIVO DE AUDITORIO (CONTROL)

Mediante la suscripción del presente informe fotográfico, la interventoría asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. Los cuales se verificarán al momento de la visita de obra .

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 13 días del mes de junio de 2018.

Firma
 LEONIDAS TASCON GONZALEZ
 SUPERVISOR
 SECRETARÍA DE CULTURA

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO	Código MAJA01.02.02.18.P02.F16	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	xx/dic/2010

OBJETO DE LA OBRA:
Prestar sus servicios para realizar EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI, UBICADO EN LA CRA 5# 6-05 LA MERCED, en el marco del proyecto denominado CONSERVACION DEL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI, según ficha EBI 06046291 vigencia 2.018. De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios previos

En el cuadro anexo se presenta EL AVANCE FOTOGRAFICO SEMANA 3 DEL CONTRATO: 4148.010.26.444 DE 2018

OBSERVACIONES TECNICAS

No.	DESPACHO		
1			MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL DE LA AUESP
2			MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL DEL DEPOSITO DE PELICULAS

Mediante la suscripción del presente informe fotográfico, la interventoría asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. Los cuales se verificarán al momento de la visita de obra .

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 20 días del mes de junio de 2018.

Firma

LUIS EDULFO MEDINA NIEVA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE CULTURA

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO	Código MAJA01.02.02.18.P02.F16	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	xx/dic/2010

OBJETO DE LA OBRA:
Prestar sus servicios para realizar EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI, UBICADO EN LA CRA 5# 6-05 LA MERCED, en el marco del proyecto denominado CONSERVACION DEL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI, según ficha EBI 06046291 vigencia 2.018. De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios previos

En el cuadro anexo se presenta EL AVANCE FOTOGRAFICO SEMANA 4 DEL CONTRATO: 4148.010.26.444 DE 2018

OBSERVACIONES TECNICAS

No.	DESPACHO		
1			MANTENIMIENTO PRVENTIVO AL MINI SPLIT DE LA OFICINA 108
2			MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL DEL SALON MADERA

Mediante la suscripción del presente informe fotográfico, la interventoría asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. Los cuales se verificarán al momento de la visita de obra .

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 27 días del mes de junio de 2018.

Firma _____
LUIS EDULFO MEDINA NIEVA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE CULTURA

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO	Código MAJA01.02.02.18.P02.F16	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	xx/dic/2010

OBJETO DE LA OBRA:

Prestar sus servicios para realizar EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI, UBICADO EN LA CRA 5# 6-05 LA MERCED, en el marco del proyecto denominado CONSERVACION DEL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI, según ficha EBI 06046291 vigencia 2.018. De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios previos

En el cuadro anexo se presenta EL AVANCE FOTOGRAFICO SEMANA 5 DEL CONTRATO: 4148.010.26.444 DE 2018

OBSERVACIONES TECNICAS

No.	DESPACHO		
1			MANTENIMIENTO PRVENTIVO AL MINI SPLIT DE LA OFICINA 108 LA UNIDAD MANEJADORA TAKESHIMA
2			MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL DEL SALA DE EXPOSICION

Mediante la suscripción del presente informe fotográfico, la interventoría asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. Los cuales se verificarán al momento de la visita de obra .

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 4 días del mes de julio de 2018.

Firma

LUIS EDULFO MEDINA NIEVA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE CULTURA

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA FORMATO INFORME SEMANAL DE SUPERVISIÓN	Código: MAJA01.02.02.18.P02.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	xx/dic/2010

FECHA				6	6	18
CONTRATO No: 4148.010.26.444 - 2018						
Semana Número: 1		Del: 25-may-18		Al: 6-jun-18		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 13 días						
Nombre del Supervisor <u>LEONIDAS TASCON GONZALEZ</u>						

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

Prestar sus servicios para realizar EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI, UBICADO EN LA CRA 5# 6-05 LA MERCED, en el marco del proyecto denominado CONSERVACION. DEL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI, según ficha. EBI A16046291 vigencia 2.018. De conformidad . con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios previos

<table> <tr> <td></td> <td>SEMANAL</td> <td>ACUMULADO</td> </tr> <tr> <td>Obra programada (%)</td> <td>6,1611%</td> <td>6,16%</td> </tr> <tr> <td>Valor de la Obra</td> <td>\$ 89.676.972</td> <td>\$ 5.525.121</td> </tr> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra programada (%)	6,1611%	6,16%	Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 5.525.121	<table> <tr> <td></td> <td>SEMANAL</td> <td>ACUMULADO</td> </tr> <tr> <td>Obra Física Ejecutada (%)</td> <td>\$ 5.525.121</td> <td>\$ 5.525.121</td> </tr> <tr> <td>Valor de la Obra</td> <td>\$ 89.676.972</td> <td>\$ 5.525.121</td> </tr> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	\$ 5.525.121	\$ 5.525.121	Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 5.525.121
	SEMANAL	ACUMULADO																	
Obra programada (%)	6,1611%	6,16%																	
Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 5.525.121																	
	SEMANAL	ACUMULADO																	
Obra Física Ejecutada (%)	\$ 5.525.121	\$ 5.525.121																	
Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 5.525.121																	
CONTRATO DE OBRA:			SUPERVISIÓN:																
Contratista: <u>HEALTCARE NETWORKS SAS</u> Contrato No. <u>4148.010.26.444-2018</u> Valor Inicial: \$ <u>89.676.972</u> Valor Actualizado: \$ _____ Plazo Inicial: <u>Hasta 21 de Diciembre de 2018</u> Plazo Actualizado: _____ Fecha de Iniciación: <u>25 de Mayo de 2018</u> Fecha de Vencimiento: <u>21 de Diciembre de 2018</u>			Supervisor: <u>LEONIDAS TASCON GONZALEZ</u> Contrato No. <u>NA</u> Valor Inicial: \$ <u>89.676.972</u> Valor Actualizado: \$ _____ Plazo Inicial: <u>Hasta 21 de Diciembre de 2018</u> Plazo Actualizado: _____ Fecha de Iniciación: <u>25 de Mayo de 2018</u> Fecha de Vencimiento: <u>21 de Diciembre de 2018</u>																

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DOS AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU DE OFI 218 AUDIOVISUALES (CABIO DE CONTACTORES Y CARGA DE REFRIGERANTE R22), MATENIMIENTO CORRECTIVO DE AUDITORIO (CONTROL), MANTENIMIENTO DE FANCOIN DE LA RED DE BIBLIOTECAS 24000 BTU, CAMBIO DE BATERIAS DE LOS TERMOSTATOS DE LAS UMAS DE LOS CHILLERS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UMA DE ARCHIVO HISTORICOS

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

MANTENIMIENTO DE CHILLER 1, CAMBIO DE GUARDAMOTOR DE 65A DEL CHILLER 1, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL COMPRESOR DE 20 TOLNELADAS Y UNO DE 10 TONELADAS

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1- CRONOGRAMA : LA PRIMERA SEMANA CUMPLE CON LO PROYECTADO 100%
 2- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: EL CONTRATISTA CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
 3- CALIDAD DE LOS TRABAJOS: BUENA CALIDAD
 4- MANEJO AMBIENTAL: SE REALIZA DEMARCACIÓN DE SEGURIDAD
 5- SEGURIDAD INDUSTRIAL : AL INICIO SE HACE ENTREGA DE DOTACION A TODOS LOS TRABAJADORES COMO GUANTES , CASCO, ETC.
 6- PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 2 PERSONAS INCLUIDO EL TECNICO 1A.
 7- APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: SE PRESENTA PLANILLAS DE PAGO MES MAYO

OBSERVACIONES	SUPERVISOR
VISITA TECNICA DE SISO	Firma _____ Nombre: <u>LEONIDAS TASCON GONZALEZ</u> M.P: _____

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA FORMATO INFORME SEMANAL DE SUPERVISIÓN	Código: MAJA01.02.02.18.P02.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	xx/dic/2010

FECHA	13	6	18
CONTRATO No: 4148.010.26.444 - 2018			
Semana Número:	2	Del:	7-jun-18
		Al:	13-jun-18

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 20 días

Nombre del Supervisor LEONIDAS TASCON GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

Prestar sus servicios para realizar EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI, UBICADO EN LA CRA 5# 6-05 LA MERCED, en el marco del proyecto denominado CONSERVACION. DEL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO SANrIAGO DE CALI, según ficha. EBI A16046291 vigencia 2.018. De conformidad . con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios previos

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,3175%	9,4786%	Obra Física Ejecutada (%)	\$ 2.975.034	\$ 8.500.155
Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 8.500.155	Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 8.500.155

CONTRATO DE OBRA:		SUPERVISIÓN:	
Contratista:	HEALTCARE NETWORKS SAS	Supervisor:	LEONIDAS TASCON GONZALEZ
Contrato No.	4148.010.26.444-2018	Contrato No.	NA
Valor Inicial:	\$ 89.676.972	Valor Inicial:	\$ 89.676.972
Valor Actualizado:	\$	Valor Actualizado:	\$
Plazo Inicial:	Hasta 21 de Diciembre de 2018	Plazo Inicial:	Hasta 21 de Diciembre de 2018
Plazo Actualizado:		Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	25 de Mayo de 2018	Fecha de Iniciación:	25 de Mayo de 2018
Fecha de Vencimiento:	21 de Diciembre de 2018	Fecha de Vencimiento:	21 de Diciembre de 2018

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

MANTENIMIENTO DE CHILLER 1, CAMBIO DE GUARDAMOTOR DE 65A DEL CHILLER 1, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL COMPRESOR DE 20 TOLNELADAS Y UNO DE 10 TONELADAS

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL DE LA AUESP, MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL DEL DEPOSITO DE PELICULAS

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1- CRONOGRAMA : LA PRIMERA SEMANA CUMPLE CON LO PROYECTADO 100%

2- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: EL CONTRATISTA CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

3- CALIDAD DE LOS TRABAJOS: BUENA CALIDAD

4- MANEJO AMBIENTAL: SE REALIZA DEMARCACIÓN DE SEGURIDAD

5- SEGURIDAD INDUSTRIAL : AL INICIO SE HACE ENTREGA DE DOTACION A TODOS LOS TRABAJADORES COMO GUANTES , CASCO, ETC.

6- PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 2 PERSONAS INCLUIDO EL TECNICO 1A.

7- APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

OBSERVACIONES	SUPERVISOR
	Firma Nombre: <u>LEONIDAS TASCON GONZALEZ</u> M.P:

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA FORMATO INFORME SEMANAL DE SUPERVISIÓN	Código: MAJA01.02.02.18.P02.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	xx/dic/2010

FECHA	20	6	18
CONTRATO No: 4148.010.26.444 - 2018			

Semana Número: 3	Del: 14-jun-18	Al: 20-jun-18
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 27 días		
Nombre del Supervisor LEONIDAS TASCON GONZALEZ		

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Prestar sus servicios para realizar EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI, UBICADO EN LA CRA 5# 6-05 LA MERCED, en el marco del proyecto denominado CONSERVACION. DEL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO SAN'rIAGO DE CALI, según ficha. EBI A16046291 vigencia 2.018. De conformidad . con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios previos
--

<table> <tr> <td></td> <td>SEMANAL</td> <td>ACUMULADO</td> </tr> <tr> <td>Obra programada (%)</td> <td>3,3175%</td> <td>12,7961%</td> </tr> <tr> <td>Valor de la Obra</td> <td>\$ 89.676.972</td> <td>\$ 11.475.188</td> </tr> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra programada (%)	3,3175%	12,7961%	Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 11.475.188	<table> <tr> <td></td> <td>SEMANAL</td> <td>ACUMULADO</td> </tr> <tr> <td>Obra Física Ejecutada (%)</td> <td>\$ 2.975.034</td> <td>\$ 11.475.188</td> </tr> <tr> <td>Valor de la Obra</td> <td>\$ 89.676.972</td> <td>\$ 11.475.188</td> </tr> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	\$ 2.975.034	\$ 11.475.188	Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 11.475.188
	SEMANAL	ACUMULADO																	
Obra programada (%)	3,3175%	12,7961%																	
Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 11.475.188																	
	SEMANAL	ACUMULADO																	
Obra Física Ejecutada (%)	\$ 2.975.034	\$ 11.475.188																	
Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 11.475.188																	

CONTRATO DE OBRA: Contratista: HEALTCARE NETWORKS SAS Contrato No. 4148.010.26.444-2018 Valor Inicial: \$ 89.676.972 Valor Actualizado: \$ Plazo Inicial: Hasta 21 de Diciembre de 2018 Plazo Actualizado: Fecha de Iniciación: 25 de Mayo de 2018 Fecha de Vencimiento: 21 de Diciembre de 2018	SUPERVISIÓN: Supervisor: LEONIDAS TASCON GONZALEZ Contrato No. NA Valor Inicial: \$ 89.676.972 Valor Actualizado: \$ Plazo Inicial: Hasta 21 de Diciembre de 2018 Plazo Actualizado: Fecha de Iniciación: 25 de Mayo de 2018 Fecha de Vencimiento: 21 de Diciembre de 2018
--	--

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL DE LA AUESP, MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL DEL DEPOSITO DE PELICULAS

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA MANTENIMIENTO PRVENTIVO AL MINI SPLIT DE LA OFICINA 108, MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL DEL SALON MADERA
--

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO 1- CRONOGRAMA : LA PRIMERA SEMANA CUMPLE CON LO PROYECTADO 100% 2- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: EL CONTRATISTA CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. 3- CALIDAD DE LOS TRABAJOS: BUENA CALIDAD 4- MANEJO AMBIENTAL: SE REALIZA DEMARCACIÓN DE SEGURIDAD 5- SEGURIDAD INDUSTRIAL : AL INICIO SE HACE ENTREGA DE DOTACION A TODOS LOS TRABAJADORES COMO GUANTES , CASCO, ETC. 6- PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 2 PERSONAS INCLUIDO EL TÉCNICO 1A. 7- APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:
--

OBSERVACIONES	SUPERVISOR Firma Nombre: LEONIDAS TASCON GONZALEZ M.P:
-----------------------------	---

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA FORMATO INFORME SEMANAL DE SUPERVISIÓN	Código: MAJA01.02.02.18.P02.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	xx/dic/2010

FECHA	27	6	18
CONTRATO No: 4148.010.26.444 - 2018			

Semana Número: 4	Del: 21-jun-18	Al: 27-jun-18
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 41 días		
Nombre del Supervisor <u>LEONIDAS TASCON GONZALEZ</u>		

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Prestar sus servicios para realizar EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI, UBICADO EN LA CRA 5# 6-05 LA MERCED, en el marco del proyecto denominado CONSERVACION. DEL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI, según ficha. EBI A16046291 vigencia 2.018. De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios previos
--

<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SEMANAL</td> <td>ACUMULADO</td> </tr> <tr> <td>Obra programada (%)</td> <td>3,3175%</td> <td>16,1136%</td> </tr> <tr> <td>Valor de la Obra</td> <td>\$ 89.676.972</td> <td>\$ 14.450.222</td> </tr> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra programada (%)	3,3175%	16,1136%	Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 14.450.222	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SEMANAL</td> <td>ACUMULADO</td> </tr> <tr> <td>Obra Física Ejecutada (%)</td> <td>\$ 2.975.034</td> <td>\$ 14.450.222</td> </tr> <tr> <td>Valor de la Obra</td> <td>\$ 89.676.972</td> <td>\$ 14.450.222</td> </tr> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	\$ 2.975.034	\$ 14.450.222	Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 14.450.222
	SEMANAL	ACUMULADO																	
Obra programada (%)	3,3175%	16,1136%																	
Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 14.450.222																	
	SEMANAL	ACUMULADO																	
Obra Física Ejecutada (%)	\$ 2.975.034	\$ 14.450.222																	
Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 14.450.222																	
CONTRATO DE OBRA: Contratista: <u>HEALTCARE NETWORKS SAS</u> Contrato No. <u>4148.010.26.444-2018</u> Valor Inicial: \$ <u>89.676.972</u> Valor Actualizado: \$ _____ Plazo Inicial: <u>Hasta 21 de Diciembre de 2018</u> Plazo Actualizado: _____ Fecha de Iniciación: <u>25 de Mayo de 2018</u> Fecha de Vencimiento: <u>21 de Diciembre de 2018</u>	SUPERVISIÓN: Supervisor: <u>LEONIDAS TASCON GONZALEZ</u> Contrato No. <u>NA</u> Valor Inicial: \$ <u>89.676.972</u> Valor Actualizado: \$ _____ Plazo Inicial: <u>Hasta 21 de Diciembre de 2018</u> Plazo Actualizado: _____ Fecha de Iniciación: <u>25 de Mayo de 2018</u> Fecha de Vencimiento: <u>21 de Diciembre de 2018</u>																		

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA MANTENIMIENTO PRVENTIVO AL MINI SPLIT DE LA OFICINA 108, MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL DEL SALON MADERA

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA MANTENIMIENTO PRVENTIVO AL MINI SPLIT DE LA OFICINA 108 LA UNIDAD MANEJADORA TAKESHIMA, MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL DEL SALA DE EXPOSICION
--

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO 1- CRONOGRAMA : LA PRIMERA SEMANA CUMPLE CON LO PROYECTADO 100% 2- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: EL CONTRATISTA CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. 3- CALIDAD DE LOS TRABAJOS: BUENA CALIDAD 4- MANEJO AMBIENTAL: SE REALIZA DEMARCACIÓN DE SEGURIDAD 5- SEGURIDAD INDUSTRIAL : AL INICIO SE HACE ENTREGA DE DOTACION A TODOS LOS TRABAJADORES COMO GUANTES , CASCO, ETC. 6- PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 2 PERSONAS INCLUIDO EL TECNICO 1A. 7- APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

OBSERVACIONES	SUPERVISOR Firma _____ Nombre: <u>LEONIDAS TASCON GONZALEZ</u> M.P: _____
----------------------	---

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA FORMATO INFORME SEMANAL DE SUPERVISIÓN	Código: MAJA01.02.02.18.P02.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	xx/dic/2010

FECHA		4	7	18
CONTRATO No:		4148.010.26.444 - 2018		
Semana Número:	5	Del:	28-jun-18	Al:
		4-jul-18		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 48 días				
Nombre del Supervisor <u>LEONIDAS TASCON GONZALEZ</u>				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

Prestar sus servicios para realizar EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI, UBICADO EN LA CRA 5# 6-05 LA MERCED, en el marco del proyecto denominado CONSERVACION. DEL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI, según ficha. EBI A16046291 vigencia 2.018. De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios previos

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,3175%	19,4311%	Obra Física Ejecutada (%)	\$ 2.975.034	\$ 17.425.255
Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 17.425.255	Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 17.425.255
CONTRATO DE OBRA:			SUPERVISIÓN:		
Contratista:	HEALTCARE NETWORKS SAS		Supervisor:	LEONIDAS TASCON GONZALEZ	
Contrato No.	4148.010.26.444-2018		Contrato No.	NA	
Valor Inicial:	\$	89.676.972	Valor Inicial:	\$	89.676.972
Valor Actualizado:	\$		Valor Actualizado:	\$	
Plazo Inicial:	Hasta 21 de Diciembre de 2018		Plazo Inicial:	Hasta 21 de Diciembre de 2018	
Plazo Actualizado:			Plazo Actualizado:		
Fecha de Iniciación:	25 de Mayo de 2018		Fecha de Iniciación:	25 de Mayo de 2018	
Fecha de Vencimiento:	21 de Diciembre de 2018		Fecha de Vencimiento:	21 de Diciembre de 2018	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL DEL SALA DE EXPOSICION

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

mantenimiento a manejadora de la oficina corfecali, mant. A la manejadora de sala de exposición 2

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1- CRONOGRAMA : LA PRIMERA SEMANA CUMPLE CON LO PROYECTADO 100%

2- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: EL CONTRATISTA CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

3- CALIDAD DE LOS TRABAJOS: BUENA CALIDAD

4- MANEJO AMBIENTAL: SE REALIZA DEMARCACIÓN DE SEGURIDAD

5- SEGURIDAD INDUSTRIAL : AL INICIO SE HACE ENTREGA DE DOTACION A TODOS LOS TRABAJADORES COMO GUANTES , CASCO, ETC.

6- PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 2 PERSONAS INCLUIDO EL TECNICO 1A.

7- APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

OBSERVACIONES	SUPERVISOR
	Firma Nombre: <u>LEONIDAS TASCON GONZALEZ</u> M.P:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA FORMATO INFORME SEMANAL DE SUPERVISIÓN	Código: MAJA01.02.02.18.P02.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	xx/dic/2010

FECHA	11	7	18
CONTRATO No: 4148.010.26.444 - 2018			
Semana Número:	6	Del:	5-jul-18
		Al:	11-jul-18

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 55 días

Nombre del Supervisor LEONIDAS TASCON GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

Prestar sus servicios para realizar EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI, UBICADO EN LA CRA 5# 6-05 LA MERCED, en el marco del proyecto denominado CONSERVACION. DEL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO SAN'rIAGO DE CALI, según ficha. EBI AI6046291 vigencia 2.018. De conformidad . con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios previos

Obra programada (%)	SEMANAL 3,3175%	ACUMULADO 22,7486%	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL \$ 2.975.034	ACUMULADO \$ 20.400.289
Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 20.400.289	Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 20.400.289
CONTRATO DE OBRA:			SUPERVISIÓN:		
Contratista: <u>HEALT CARE NETWORKS SAS</u> Contrato No. <u>4148.010.26.444-2018</u> Valor Inicial: \$ <u>89.676.972</u> Valor Actualizado: \$ <u></u> Plazo Inicial: <u>Hasta 21 de Diciembre de 2018</u> Plazo Actualizado: <u></u> Fecha de Iniciación: <u>25 de Mayo de 2018</u> Fecha de Vencimiento: <u>21 de Diciembre de 2018</u>			Supervisor: <u>LEONIDAS TASCON GONZALEZ</u> Contrato No. <u>NA</u> Valor Inicial: \$ <u>89.676.972</u> Valor Actualizado: \$ <u></u> Plazo Inicial: <u>Hasta 21 de Diciembre de 2018</u> Plazo Actualizado: <u></u> Fecha de Iniciación: <u>25 de Mayo de 2018</u> Fecha de Vencimiento: <u>21 de Diciembre de 2018</u>		

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

mantenimiento a manejadora de la oficina corfecali, mant. A la manejadora de sala de exposición 2

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

mantenimiento a la uma 5

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

- 1- CRONOGRAMA : LA PRIMERA SEMANA CUMPLE CON LO PROYECTADO 100%
- 2- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: EL CONTRATISTA CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
- 3- CALIDAD DE LOS TRABAJOS: BUENA CALIDAD
- 4- MANEJO AMBIENTAL: SE REALIZA DEMARCACIÓN DE SEGURIDAD
- 5- SEGURIDAD INDUSTRIAL : AL INICIO SE HACE ENTREGA DE DOTACION A TODOS LOS TRABAJADORES COMO GUANTES , CASCO, ETC.
- 6- PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 2 PERSONAS INCLUIDO EL TECNICO 1A.
- 7- APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

OBSERVACIONES	SUPERVISOR
	Firma Nombre: <u>LEONIDAS TASCON GONZALEZ</u> M.P:

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA FORMATO INFORME SEMANAL DE SUPERVISIÓN	Código: MAJA01.02.02.18.P02.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	xx/dic/2010

FECHA			18	7	18
CONTRATO No: 4148.010.26.444 - 2018					
Semana Número:	7	Del:	12-jul-18	Al:	18-jul-18
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 62 días					
Nombre del Supervisor LEONIDAS TASCON GONZALEZ					

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

Prestar sus servicios para realizar EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI, UBICADO EN LA CRA 5# 6-05 LA MERCED, en el marco del proyecto denominado CONSERVACION. DEL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO SAN'IAGO DE CALI, según ficha. EBI A16046291 vigencia 2.018. De conformidad . con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios previos

<table> <tr> <td></td> <td>SEMANAL</td> <td>ACUMULADO</td> </tr> <tr> <td>Obra programada (%)</td> <td>3,3175%</td> <td>26,0661%</td> </tr> <tr> <td>Valor de la Obra</td> <td>\$ 89.676.972</td> <td>\$ 23.375.322</td> </tr> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra programada (%)	3,3175%	26,0661%	Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 23.375.322	<table> <tr> <td></td> <td>SEMANAL</td> <td>ACUMULADO</td> </tr> <tr> <td>Obra Física Ejecutada (%)</td> <td>\$ 2.975.034</td> <td>\$ 23.375.322</td> </tr> <tr> <td>Valor de la Obra</td> <td>\$ 89.676.972</td> <td>\$ 23.375.322</td> </tr> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	\$ 2.975.034	\$ 23.375.322	Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 23.375.322
	SEMANAL	ACUMULADO																	
Obra programada (%)	3,3175%	26,0661%																	
Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 23.375.322																	
	SEMANAL	ACUMULADO																	
Obra Física Ejecutada (%)	\$ 2.975.034	\$ 23.375.322																	
Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 23.375.322																	
CONTRATO DE OBRA:			SUPERVISIÓN:																
Contratista: HEALTCARE NETWORKS SAS Contrato No. 4148.010.26.444-2018 Valor Inicial: \$ 89.676.972 Valor Actualizado: \$ Plazo Inicial: Hasta 21 de Diciembre de 2018 Plazo Actualizado: Fecha de Iniciación: 25 de Mayo de 2018 Fecha de Vencimiento: 21 de Diciembre de 2018			Supervisor: LEONIDAS TASCON GONZALEZ Contrato No. NA Valor Inicial: \$ 89.676.972 Valor Actualizado: \$ Plazo Inicial: Hasta 21 de Diciembre de 2018 Plazo Actualizado: Fecha de Iniciación: 25 de Mayo de 2018 Fecha de Vencimiento: 21 de Diciembre de 2018																

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

mantenimiento a la uma 5

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

mantenimiento a las uma 7 y 8 archivo historico 1 y 2

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1- CRONOGRAMA : LA PRIMERA SEMANA CUMPLE CON LO PROYECTADO 100%

2- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: EL CONTRATISTA CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

3- CALIDAD DE LOS TRABAJOS: BUENA CALIDAD

4- MANEJO AMBIENTAL: SE REALIZA DEMARCACIÓN DE SEGURIDAD

5- SEGURIDAD INDUSTRIAL : AL INICIO SE HACE ENTREGA DE DOTACION A TODOS LOS TRABAJADORES COMO GUANTES , CASCO, ETC.

6- PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 2 PERSONAS INCLUIDO EL TECNICO 1A.

7- APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

OBSERVACIONES	SUPERVISOR
	Firma Nombre: LEONIDAS TASCON GONZALEZ M.P:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA FORMATO INFORME SEMANAL DE SUPERVISIÓN	Código: MAJA01.02.02.18.P02.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	xx/dic/2010

FECHA	25	7	18
CONTRATO No: 4148.010.26.444 - 2018			
Semana Número:	8	Del:	19-jul-18
		Al:	25-jul-18

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 69 días

Nombre del Supervisor LEONIDAS TASCON GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

Prestar sus servicios para realizar EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI, UBICADO EN LA CRA 5# 6-05 LA MERCED, en el marco del proyecto denominado CONSERVACION. DEL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO SANrAGO DE CALI, según ficha. EBI A16046291 vigencia 2.018. De conformidad . con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios previos

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,3175%	29,3836%	Obra Física Ejecutada (%)	\$ 2.975.034	\$ 26.350.356
Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 26.350.356	Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 26.350.356

CONTRATO DE OBRA:		SUPERVISIÓN:	
Contratista:	HEALTCARE NETWORKS SAS	Supervisor:	LEONIDAS TASCON GONZALEZ
Contrato No.	4148.010.26.444-2018	Contrato No.	NA
Valor Inicial:	\$ 89.676.972	Valor Inicial:	\$ 89.676.972
Valor Actualizado:	\$	Valor Actualizado:	\$
Plazo Inicial:	Hasta 21 de Diciembre de 2018	Plazo Inicial:	Hasta 21 de Diciembre de 2018
Plazo Actualizado:		Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	25 de Mayo de 2018	Fecha de Iniciación:	25 de Mayo de 2018
Fecha de Vencimiento:	21 de Diciembre de 2018	Fecha de Vencimiento:	21 de Diciembre de 2018

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

mantenimiento a las uma 7 y 8 archivo historico 1 y 2

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

mantenimiento a mini split y consaloo de las ofcnas vive digital rack y vive digital zonas comunes

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1- CRONOGRAMA : LA PRIMERA SEMANA CUMPLE CON LO PROYECTADO 100%

2- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: EL CONTRATISTA CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

3- CALIDAD DE LOS TRABAJOS: BUENA CALIDAD

4- MANEJO AMBIENTAL: SE REALIZA DEMARCACIÓN DE SEGURIDAD

5- SEGURIDAD INDUSTRIAL : AL INICIO SE HACE ENTREGA DE DOTACION A TODOS LOS TRABAJADORES COMO GUANTES , CASCO, ETC.

6- PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 2 PERSONAS INCLUIDO EL TECNICO 1A.

7- APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

OBSERVACIONES	SUPERVISOR
	Firma Nombre: <u>LEONIDAS TASCON GONZALEZ</u> M.P:

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA FORMATO INFORME SEMANAL DE SUPERVISIÓN	Código: MAJA01.02.02.18.P02.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	xx/dic/2010

FECHA	2	8	18
CONTRATO No: 4148.010.26.444 - 2018			

Semana Número: 9	Del: 26-jul-18	Al: 2-ago-18
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 76 días		
Nombre del Supervisor <u>LEONIDAS TASCON GONZALEZ</u>		

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Prestar sus servicios para realizar EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI, UBICADO EN LA CRA 5# 6-05 LA MERCED, en el marco del proyecto denominado CONSERVACION. DEL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO SANrIAGO DE CALI, según ficha. EBI AI6046291 vigencia 2.018. De conformidad . con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios previos
--

<table> <tr> <td></td> <td>SEMANAL</td> <td>ACUMULADO</td> </tr> <tr> <td>Obra programada (%)</td> <td>3,3175%</td> <td>32,7011%</td> </tr> <tr> <td>Valor de la Obra</td> <td>\$ 89.676.972</td> <td>\$ 29.325.389</td> </tr> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra programada (%)	3,3175%	32,7011%	Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 29.325.389	<table> <tr> <td></td> <td>SEMANAL</td> <td>ACUMULADO</td> </tr> <tr> <td>Obra Física Ejecutada (%)</td> <td>\$ 2.975.034</td> <td>\$ 29.325.389</td> </tr> <tr> <td>Valor de la Obra</td> <td>\$ 89.676.972</td> <td>\$ 29.325.389</td> </tr> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	\$ 2.975.034	\$ 29.325.389	Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 29.325.389
	SEMANAL	ACUMULADO																	
Obra programada (%)	3,3175%	32,7011%																	
Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 29.325.389																	
	SEMANAL	ACUMULADO																	
Obra Física Ejecutada (%)	\$ 2.975.034	\$ 29.325.389																	
Valor de la Obra	\$ 89.676.972	\$ 29.325.389																	

CONTRATO DE OBRA: Contratista: <u>HEALTHCARE NETWORKS SAS</u> Contrato No. <u>4148.010.26.444-2018</u> Valor Inicial: \$ <u>89.676.972</u> Valor Actualizado: \$ _____ Plazo Inicial: <u>Hasta 21 de Diciembre de 2018</u> Plazo Actualizado: _____ Fecha de Iniciación: <u>25 de Mayo de 2018</u> Fecha de Vencimiento: <u>21 de Diciembre de 2018</u>	SUPERVISIÓN: Supervisor: <u>LEONIDAS TASCON GONZALEZ</u> Contrato No. <u>NA</u> Valor Inicial: \$ <u>89.676.972</u> Valor Actualizado: \$ _____ Plazo Inicial: <u>Hasta 21 de Diciembre de 2018</u> Plazo Actualizado: _____ Fecha de Iniciación: <u>25 de Mayo de 2018</u> Fecha de Vencimiento: <u>21 de Diciembre de 2018</u>
--	---

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA mantenimiento a mini split y consaloo de las ofcinas vive digital rack y vive digital zonas comunes

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA mantenimiento a minisplit y manejadora de la biblioteca

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO 1- CRONOGRAMA : LA PRIMERA SEMANA CUMPLE CON LO PROYECTADO 100% 2- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: EL CONTRATISTA CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. 3- CALIDAD DE LOS TRABAJOS: BUENA CALIDAD 4- MANEJO AMBIENTAL: SE REALIZA DEMARCACIÓN DE SEGURIDAD 5- SEGURIDAD INDUSTRIAL : AL INICIO SE HACE ENTREGA DE DOTACION A TODOS LOS TRABAJADORES COMO GUANTES , CASCO, ETC. 6- PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 2 PERSONAS INCLUIDO EL TECNICO 1A. 7- APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

OBSERVACIONES	SUPERVISOR Firma Nombre: <u>LEONIDAS TASCON GONZALEZ</u> M.P:
----------------------	---

REGISTRO DE SERVICIO TÉCNICO



1/F/02/03

NIT. 800.195.522-1

No.:

EMPRESA:	Secretaria de cultura		NIT:	890399011-3	
CONTACTO:	Jimmy Muñoz		CELULAR:	8895035	
CARGO:	MTT electrico	CIUDAD:	cali	FECHA:	1
EMAIL:		MAQUINA:	ASCENSOR NO 1	COD:	
NOMBRE DEL TÉCNICO: Oscar Tzinow					

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO / APROBADO

Inspeccion Ascensor

REPORTE DEL SERVICIO REALIZADO

Se reviso el ascensores y se encontro problemas en la empaquetadura en el reductor del Ascensor No 1 tambien se revisaron los cables viajeros sistema de Seguridad, antiapeso

→ Hay que arreglar la fuga de aceite del reductor

HORA INICIO:	HORA FINAL:	COTIZACION:
--------------	-------------	-------------

OBSERVACIONES

El Ascensor se encuentra funcionando normalmente

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA FACTURA O LETRA DE CAMBIO
CONFORME AL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMMERIO

SERVICIO REALIZADO POR:

NOMBRE Y C.C. - CLIENTE (Firma y sello)

INSTRUMENTACIÓN - MONTAJE - AUTOMATIZACIÓN - SEÑALES - TÉCNICAS INDUSTRIALES DE CONTROL
Carrera 23 # 57 - 49 PBX: (2) 438 11 81 - 438 11 95 FAX: (2) 683 00 52 Web: www.imaticingenieria.com
e-mail: imaticing@yahoo.com; administracion@imaticingenieria.com Cali - Valle del Cauca
HOJA BLANCA: EMPRESA; HOJA VERDE: CLIENTE; HOJA AMARILLA: CONTABILIDAD

C. DE C.: 0916

LISTA DE CHEQUEO ASCENSOR 1 DE SECRETARIA DE CULTURA



2/F/01/15 - RST

item	MANTENIMIENTO MECANICO	FECHA: AGOSTO 9 DEL 2018	SI REALIZADO	NO REALIZADO
1.0	Visita Mensual			
1.1	LIMPIEZA DE RIEL GUIA DESPLAZAMIENTO DE PUERTA EXTERNA DE ACCESO POR PISO		✓	
1.2	LIMPIEZA DE GUIA INTERNA DE PUERTA EXTERNA DE ACCESO CARGA		✓	
1.3	LIMPIEZA DE RIEL INTERNO DE DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA		✓	
1.4	LIMPIEZA DE RIEL GUIA DE DESPLAZAMIENTO DE PUERTA INTERNA (REJA)		✓	
1.5	LIMPIEZA DE SOPORTE GUIA EXTERNA DE LAS PUERTAS INTERNAS		✓	
1.6	REVISION DE GUIAS DESPLAZAMIENTO CONTRAPESO		✓	
1.7	REVISION DE GUIAS DESPLAZAMIENTO PUERTA INTERNA Y EXTERNA		✓	
1.8	AJUSTE DE GUIAS PUERTAS EXTERNAS POR PISO		✓	
1.9	AJUSTE DE GUIAS PUERTAS INTERNAS (REJA)		✓	
1.10	REVISION DE ESTADO Y LUBRICACION DE RIELES PLATAFORMA ASCENSOR			
1.11	REVISION DE ESTRUCTURA DE PUERTAS EXTERNAS POR PISO		✓	
1.12	REVISION DE ESTRUCTURA DE PUERTAS INTERNAS		✓	
1.13	LIMPIEZA DEL DEPOSITO DE ACEITE LUBRICACION RIELES PLATAFORMA		✓	
1.14	LLENADO DEL DEPOSITO DE ACEITE LUBRICACION RIELES PLATAFORMA		✓	
1.15	APLICACIÓN DE DESENGRASANTE EN AEROSOL PARA LAS CADENAS PUERTAS INTERNAS		✓	
1.16	APLICACIÓN DE LUBRICACION EN AEROSOL PARA LAS CADENAS PUERTAS INTERNAS		✓	
1.17	INSPECCION VISUAL DE OBJETOS Y HUMEDA EN EL FOSO		✓	
1.18	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL FOSO		✓	
1.19	REVISION DE CABLE DE ACERO "GUAYA" Y POLEA GUIA DE POSICIONAMIENTO DEL ENCODER		✓	
1.20	INSPECCION VISUAL DEL CABLE DE ACERO Y POLEAS GUIAS PARA LA PLATAFORMA		✓	
1.21	ENGRASE DE LOS EJES DE LAS POLEAS PARTE SUPERIOR DEL ASCENSOR		✓	
1.22	REVISION DE GUARDA PISO METALICO ENTRADA A PLATAFORMA ASCENSOR POR PISO		✓	
1.23	REVISION DEL NIVEL DEL ACEITE DE LA CAJA REDUCTORA DEL MOTOR OC		✓	
1.24				
2.0	Visita Semestral			
2.1	INSPECCION VISUAL AL SISTEMA MECANICO DE LA CAJA REDUCTORA		✓	
2.2	AJUSTE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE CONTRAPESO		✓	
2.3	INSPECCION VISUAL DEL ESTADO DE LOS RODAMIENTOS DE LAS POLEAS DEL CABLE DE ACERO PLATAFORMA Y CONTRAPESO		✓	
2.4				
3.0	Visita Según requerimiento			
3.1	CAMBIO DE RETENES CAJA REDUCTORA MOTOR DC			
3.2	CAMBIO DE EMPAQUES DEL PRENSA ESTOPA O SELLO MECANICO DEL REDUCTOR MOTOS OC			
3.3	CAMBIO DE RODAMIENTOS CAJA REDUCTORA			
3.4	CAMBIO DE PIÑONES Y/O SINFIN CORONA DE LA CAJA REDUCTORA MOTOR OC			
3.5	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE POLEA GUIA CABLE DE GUARDA			
3.6	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE POLEA GUIA CABLE DE ACERO CONTRAPESO			
3.7	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE POLEAS CABLE DE ACERO ASCENSOR			
3.8				
OBSERVACIONES:				
IMATIC INGENIERIA LTDA - ESPACIOS PARA FIRMAS Y SELLOS RESPECTIVOS DE APROBACION Y ACEPTACION				
PROVEEDOR		CLIENTE		
		Inspeccion: Wilson Henao Jimmy MB		

INSTRUMENTACION - MONTAJE - AUTOMATIZACION - TECNICAS INDUSTRIALES DE CONTROL - ING. MECANICA - PRODUCTOS

Cra 23 # 57 - 49 Tel. (2) - 4381181 - 95 - 1441 FAX: (2) - 6830052 e-mail: imatic@ymail.com web: www.imaticingenieria.com

Cali - Valle - Colombia - Sur America

C. DE C.: 0916

LISTA DE CHEQUEO ASCENSOR 1 DE SECRETARIA DE CULTURA



2/F/01/15 - RST

Item	MANTENIMIENTO ELECTRICO	FECHA: AGOSTO 9 DEL 2018	SI REALIZADO	NO REALIZADO
1.0	Visita Bimensual			
1.1	INSPECCION VISUAL A CABLE DE CONTROL Y POTENCIA		✓	
1.2	REVISION Y LIMPIEZA INTERNA DEL TABLERO Y PARTES DE MANIOBRA ELECTRICA		✓	
1.3	AJUSTE DE CONEXIONES EN EQUIPOS DE CONTROL Y MANIOBRA ELECTRICA COMO PLC, CONTACTORES,		✓	
1.4	LIMPIEZA DE CONTACTORES Y RELE DE CONTROL		✓	
1.5	REVISION Y LIMPIEZA DE VARIADOR DE DC		✓	
1.6	REVISION DE ESCOBILLAS Y AJUSTES DE CONEXIONES EN EL MOTOR DC			
1.7	CAMBIO DE ESCOBILLAS DE MOTOR DC			
1.8	REVISION Y LIMPIEZA DEL CONTACTOR DEL INDUCIDO DEL MOTOR DC		✓	
1.9	MEDICION DEL VOLTAJE DE MOTOR DC-VOLTAJE INDUCIDO "ARMADURA"		✓	
1.10	MEDICION DE CORRIENTE DE MOTOR DC - ARMADURA			
1.11	MEDICION DE VOLTAJE DE MOTOR DC - VOLTAJE EXCITACIÓN "CAMPO"			
1.12	MEDICION DE CORRIENTE DE MOTOR DC- EXCITACIÓN			
1.13	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN LOS DOS SENTIDOS DE GIRO DEL MOTOR DC	AC	✓	
1.14	REVISION DE MOTOR VENTILADOR AC			
1.15	AJUSTE DE CONEXIONES DEL MOTOR VENTILADOR AC		✓	
1.16	MEDICION DE VOLTAJE DE MOTOR VENTILADOR		✓	
1.17	MEDICION DE CORRIENTE DE MOTOR VENTILADOR		✓	
1.18	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR VENTILADOR			
1.19	LIMPIEZA Y AJUSTE DE BORNES DE LOS MICROS PUERTAS INTERNAS Y EXTERNAS			
1.20	REVISION Y LIMPIEZA DE SENSOR FOTOELECTRICO DE HORQUILLA			
1.21	REVISION Y LIMPIEZA DE SENSORES INDUCTIVOS DE POSICION Y CAMBIO DE VELOCIDAD PARA EL MOTOR DC			
1.22	REVISION Y AJUSTE POSICION CAMBIO DE SENSORES INDUCTIVOS DE PUERTAS		✓	
1.23	LIMPIEZA Y REVISION DE LUMINARIA INTERNA ASCENSOR Y LAMPARA EXTERNA SUPERIOR			
1.24	REVISION DE LAMPARA ILUMINACION DEL FOSO		✓	
1.25	REVISION DE LA BOBINA DEL FRENO		✓	
1.26	REVISION DE FILTRO MOTOR VENTILADOR A ROTOR MOTOR DC		✓	
2.0	Visita Semestral			
2.1	LIMPIEZA DE CONTACTOS DEL CONTACTOR		✓	
2.2	MEDICION DE AISLAMIENTO DE MOTOR DC -ARMADURA			
2.3	MEDICION DE AISLAMIENTO DE MOTOR DC - EXCITACIÓN			
2.4	REVISION DE RODAMIENTOS DEL MOTOR DC			
2.5	MEDICION DE AISLAMIENTO DE MOTOR VENTILADOR			
2.6	REVISION DE RODAMIENTOS DEL MOTOR VENTILADOR		✓	
2.7	LIMPIEZA Y REVISION DE DISPLAY INDICADOR DE PISO Y PULSADORES DE LLAMADO		✓	
2.8	DESMONTE Y LIMPIEZA DE TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA AUTOMATISMO		✓	
2.9	REVISION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD: CELDA CONTROL DE PESO, MICRO FIN DE CARRERA POR SOB		✓	
2.10	PRUEBA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD: CELDA DE CONTROL PESO Y FRENO		✓	
3.0	Visita Según requerimiento			
3.1	CAMBIO DE CONTACTOS DE LOS CONTACTORES		✓	
3.2	COPIA DE PROGRAMA APLICACIÓN DE VARIADOR DC			
3.3	CAMBIO DE MICRO FINAL DE CARRERA POR DESGASTE MECANICO Y ELECTRICO		✓	
3.4	REPOSICION DE DISPLAY INDICADOR DE PISO Y PULSADORES DE LLAMADO		✓	
3.5			✓	
3.6	REVISION DE AUTOMATISMO			
3.7	COPIA DE PROGRAMA APLICACIÓN AUTOMATISMO			
OBSERVACIONES:				
IMATIC INGENIERIA LTDA - ESPACIOS PARA FIRMAS Y SELLOS RESPECTIVOS DE APROBACION Y ACEPTACION				
PROVEEDOR		CLIENTE		
		Inspecc. WILSON HERRERA Jimmy MUÑOZ		

REGISTRO DE SERVICIO TÉCNICO



1/E/02/03

NIT. 800.195.522-1

No.: 119

EMPRESA	Secretaria de cultura	NIT	890399011-3
CONTACTO	JIMMY MUÑOZ	CELULAR	8895035
CARGO	MTT electrico	CUIDAD	CAI
EMAIL		MASQUINA	ASCENSOR NO 1
		FECHA	
		COD	

NOMBRE DEL TECNICO	OSCAR TZINCON
--------------------	---------------

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO / APROBADO

Inspección ASCENSOR

REPORTE DEL SERVICIO REALIZADO

SE REVISÓ EL ASCENSORES Y SE ENCONTRÓ PROBLEMAS EN LA EMPAQUETADURA EN EL REDUCTOR DEL ASCENSOR NO 1 TAMBIEN SE REVISARON LOS CABLES VIAJEROS SISTEMA DE SEGURIDAD, CONTIAPESO

→ Hay que arreglar la fuga de aceite del reductor

HORA INICIO:	HORA FINAL:	COTIZACION:
--------------	-------------	-------------

OBSERVACIONES

El ASCENSOR SE ENCUENTRA FUNCIONANDO NORMALMENTE


ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA FACTURA O LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

SERVICIO REALIZADO POR:

NOMBRE Y C.C. - CLIENTE (Firma y sello)

IMPRESA: 23 437 - 40 PISO: (2) 438 11 81 - 438 11 85 FAX: (2) 683 05 02 Web: www.imaticingenieria.com
e-mail: imaticing@yahoo.com; administracion@imaticingenieria.com Cali - Valle del Cauca
HOJA BLANCA CAMPEÑA HOJA VERDE CLIENTE HOJA AMARILLA CONTABILIDAD

REGISTRO DE SERVICIO TÉCNICO




1/7/02/03

NIT. 800.195.522-1

No.: 117

EMPRESA:	Secretaría de Cultura		NIT:	890 399 011-3	
CONTACTO:	Simmy Muñoz		CELULAR:	301 226 20 92	
CARGO:	MTH Electrico	CUIDAD:	Cali	FECHA:	16-03-2003
EMAIL:		MAQUINA:	Ascensor 1, 2	COD:	
NOMBRE DEL TÉCNICO: David Herrera y Oscar Zúñiga					
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO/APROBADO					
Ascensor con problemas en la tarjeta controladora del variador OTIS modelo OVF 10					
REPORTE DEL SERVICIO REALIZADO					
Se procedió a cambiar la Tarjeta del controlador del variador del ascensor No 2 para probarla en el ascensor No 1, el cual esta funcionando normalmente; por lo que se dejó en el ascensor No 1. también se procedió a cambiar los chips de memoria del controlador variador No 1 a la tarjeta del controlador del ascensor No 2 ya que en el primer piso no había puertas. Se hicieron pruebas, se verificó seguridad y se dejó en funcionamiento.					
HORA INICIO: 6:30 am		HORA FINAL: 11:45 am		COTIZACION: 0916	
OBSERVACIONES					
el ascensor queda funcionando normalmente					
ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA FACTURA O LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO					
 SERVICIO REALIZADO POR:			 NOMBRE Y C.C. - CLIENTE (Firma y sello)		
INSTRUMENTACION - MONTAJE - AUTOMATIZACION - SEÑALES TÉCNICAS INDUSTRIALES DE CONTROL Calle 23# 57 - 49 PBX (2) 438 11 01 - 438 11 05 FAX (2) 492 02 50 Web: www.imaticingenia.com e-mail: imaticino@yahoo.com; administracion@imaticingenia.com Cali - Valle del Cauca HOJA BLANCA: EMPRESA; HOJA VERDE: CLIENTE; HOJA AMARILLA: CONTABILIDAD					

REGISTRO DE SERVICIO TÉCNICO



1/F/02/03

NIT. 800.195.522-1

No.: 116.

EMPRESA:	Secretaría de Cultura	NIT:	880 399 0011-3
CONTACTO:	Wilson Henao	CELULAR:	312 523 675
CARGO:	Electricista NIT	CIUDAD:	Calí
EMAIL:		MAQUINA:	Ascensor 1
		FECHA:	14-08-2018
		COD:	

NOMBRE DEL TÉCNICO: Oscar Zuncon

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO / APROBADO

Ascensor con problemas #1

REPORTE DEL SERVICIO REALIZADO

Se verificaron las tarjetas de control y variador encontrándose daño en el variador de marca OTIS OVFI0 el cual no responde los llamados.

Ref GCA Z6800H

HORA INICIO: 7:30 HORA FINAL: COTIZACION:

OBSERVACIONES

El ascensor queda apagado (nº 1)

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA FACTURA O LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 773 DEL CODIGO DE COMERCIO

SERVICIO REALIZADO POR


NOMBRE Y C.C. - CLIENTE (Firma y sello)

INSTRUMENTACIÓN - MONTAJE - AUTOMATIZACIÓN - SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CONTROL
Carrera 23 # 57 - 45 PBX: (2) 430 11 91 - 430 11 95 FAX: (2) 400 00 52 Web: www.imstingenieros.com
e-mail: imatic@yaho.com; administracion@imstingenieros.com Cali - Valle del Cauca
HOJA BLANCA: EMPRESA HOJA VERDE: CLIENTE HOJA AMARILLA: CONTABILIDAD

REGISTRO DE SERVICIO TÉCNICO

1/F/02/03
IMATIC
INGENIERIA SAS
NIT. 800.195.522-1

No.: 115

EMPRESA:	Secretaria de cultura		NIT:	880 397 0011-3	
CONTACTO:	Wilson Henao		CELULAR:	317 523 675	
CARGO:	Electricista de NIT	CIUDAD:	Cal	FECHA:	13-08-2018
EMAIL:		MAQUINA	Ascensor 1 y 2	COD:	
NOMBRE DEL TÉCNICO: Oscar H. Rincon					
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO / APROBADO					
Ascensores con problemas					
REPORTE DEL SERVICIO REALIZADO					
Se reviso el ascensor No 2 por problemas de puerta. Se corrigio guias del riel a puerta externa. El ascensor 1 se quedo bloqueado					
HORA INICIO: 9:30		HORA FINAL: 18:00		COTIZACION: 0916	
OBSERVACIONES					
Se deja el ascensor No 1 apagado					
ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA FACTURA O LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO					
 SERVICIO REALIZADO POR:		 NOMBRE Y C.C. - CLIENTE (Firma y sello)			
INSTRUMENTACION - MONTAJE - AUTOMATIZACION - SEÑALES - TECNICAS INDUSTRIALES DE CONTROL Carrera 23 # 57 - 49 PBX: (2) 438 11 81 - 438 11 95 FAX: (2) 683 00 52 Web: www.imaticingenieria.com e-mail: imaticing@yahoo.com; administracion@imaticingenieria.com Cali - Valle del Cauca HOJA BLANCA: EMPRESA; HOJA VERDE: CLIENTE; HOJA AMARILLA: CONTABILIDAD					

Agosto 13

REGISTRO DE SERVICIO TÉCNICO



1/F/02/03

NIT. 800.195.522-1

No.: 114

EMPRESA	SECRETARIA DE CULTURA		NIT.	8803990011-3	
CONTACTO	Wilson Henao		CELULAR	3195298695	
CARGO	Electricista de RIT	CIUDAD	CALI VALLE	FECHA	09-08-18
EMAIL		MAQUINA	ASCENSOR	COD	
NOMBRE DEL TÉCNICO		David Henao y OSCAR RINCON			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO / APROBADO

ASCENSOR CON FALLAS

REPORTE DEL SERVICIO REALIZADO

Se colocó nuevamente el variador reparándolo, también se cambio un contactor SIEMENS de referencia 3ZT1033A el cual sus contactos se habían dañado por un telemando de referencia 2G95501
EN la cabina se encontro daño en el micro de seguridad de sobrevelocidad
L1 35 amp
L2 33 amp
L3 32 amp

HORA INICIO: 9:30	HORA FINAL:	COTIZACION: 0916
-------------------	-------------	------------------

OBSERVACIONES

El ascensor se le hicieron varias pruebas y se dejó en funcionamiento

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA FACTURA O LETRA DE CAMBIO
CONFORME AL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

[Firma]

SERVICIO REALIZADO POR:

Wilson Henao 1126504552

NOMBRE Y C.C. - CLIENTE (Firma y sello)

INSTALMENTACIÓN - MONTAJE - AUTOMATIZACIÓN - SEÑALES - TÉCNICAS INDUSTRIALES DE CONTROL
Carrera 23 # 67 - 43 PBX (5) 430 11 81 - 438 11 86 FAX (5) 883 00 52 Web: www.imaticingenieria.com
e-mail: imaticing@yahoo.com administracion@imaticingenieria.com Cali - Valle del Cauca
HOJA BLANCA: EMPRESA; HOJA VERDE: CLIENTE; HOJA AMARILLA: CONTABILIDAD
